



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12 - APQ Beni Culturali

Assessorato Pubblica Istruzione

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

12 - Beni Culturali

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - SarBC-SF1 - Studio fattibilità per individuare la strategia di sviluppo dei distretti culturali per le politiche culturali della Sardegna
2	2 - SarBC-SF2b - Studio fattibilità per il Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo – Cagliari
3	3 - SarBC2-02 - Realizzazione e allestimento Museo della Sardegna giudicale
4	4 - SarBC2-03 - Realizzazione e allestimento Museo bonifiche e elettrificazione della Sardegna Villa Dolcetta – Arborea
5	5 - SarBC2-04 - Realizzazione e allestimento del Museo del '900 e del contemporaneo
6	6 - SarBC2-05 - Valorizzazione Convento Gesuiti – Convitto Canopoleno – Sassari
7	7 - SarBC2-06 - Potenziamento e valorizzazione delle collezioni permanenti del Museo Man di Nuoro
8	8 - SarBC-SF3b - Studio di fattibilità tramite concorso di idee del Museo delle Identità di Nuoro
9	9 - SarBC2-07 - Museo archeologico nazionale e Pinacoteca nazionale. Integrazione strutturale
10	10 - SarBC2-08 - Pinacoteca nazionale. Allestimento
11	11 - SarBC2-09 - Museo archeologico nazionale storico: restauro e fruizione
12	12 - SarBC2-10 - Le statue nuragiche di Monte Prama di Cabras
13	13 - SarBC2-11 - Restauro di cinque relitti del porto di Olbia
14	14 - SarBC2-13 - Recupero edificio "La Piccola" per il museo del porto
15	15 - SarBC 2-14 - Valorizzazione museale Montevecchio
16	16 - SarBC2-15 - Restauro impianti minerari ex forge–miniera di Guspini
17	17 - SarBC2-16 - Metodologie per progettazione sostenibile paesaggio
18	18 - SarBC2-17 - Concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna
19	19 - SarBC3-18 - Centro di conservazione dei Beni Culturali - Laboratori aperti al pubblico – Sassari
20	20 - SarBC3-19 - Scuola di alta formazione per restauratori. Impianto strutturale
21	21 - SarBC-SF4b - Studio di fattibilità per la realizzazione della Fabbrica delle Arti e della Creatività del Mediterraneo
22	22 - SarBC4-21 - Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allestimento funzionale nuova sede
23	23 - SarBC4-22 - Archivi - deposito archeologici - Viale La Plaia - Cagliari. Ristrutturazione



12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
24	24 - SarBC4-23 - Archivi-deposito archeologici, viale La Plaia - Cagliari. Progettazione ampliamento
25	25 - SARBC4-24 - Recupero testimonianze storiche archivio audiovisivo RAI
26	26 - SarBC4-25 - Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico
27	27 - SarBC4-26 - Ricognizione delle banche dati del patrimonio culturale della Sardegna. Adeguamento delle banche dati agli standard richiesti
28	28 - SarBC4-27 - Digitalizzazione cartografia storica della Sardegna
29	29 - SarBC4-28 - Polo tecnologico per i beni culturali. Strutture e servizi
30	30 - SarBC4-29 - Sistema informativo georeferenziato
31	31 - SarBC-SF5 - Studio di fattibilità messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui Beni Culturali in Sardegna
32	I Atto Integrativo
32	1 - SarBD-SF1 - Studio di fattibilità sistema bibliotecario urbano Cagliari
33	2 - SarBD-SF2 - Studio fattibilità per la realizzazione dell' Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari
34	3 - SarBD-01 - Progettazione preliminare intero intervento, progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione 1° modulo funzionale Museo Regionale arte nuragica e arte contemporanea del Mediterraneo
35	4 - SarBD-02 - Museo e laboratori delle Identità
36	5 - SarBD-03 - Rete museale dei Fenici
37	6 - SarBD-04 - Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras. Documentazione, restauro e musealizzazione
38	7 - SarBD-05 - Navi romane nel porto di Olbia
39	8 - SarBD-06 - Scuola regionale di alta formazione per restauro e conservazione del patrimonio culturale-istituzionale - Li Punti Sassari
40	9 - SarBD-07 - Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di un galeone storico



12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

1 - SarBC-SF1 - Studio fattibilità per individuare la strategia di sviluppo dei distretti culturali per le politiche culturali della Sardegna

Somma stanziata: € 100.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

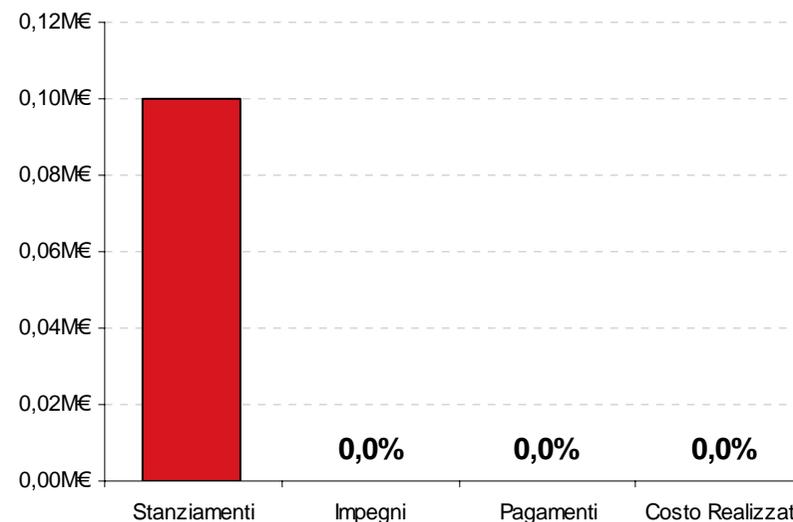

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

2 - SarBC-SF2b - Studio fattibilità per il Museo regionale dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo - Cagliari

Somma stanziata: € 100.800,00

Somma impegnata: € 100.800,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 100.800,00

% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 100.800,00

% pagato su stanziato: 100%

Stato di attuazione: Concluso

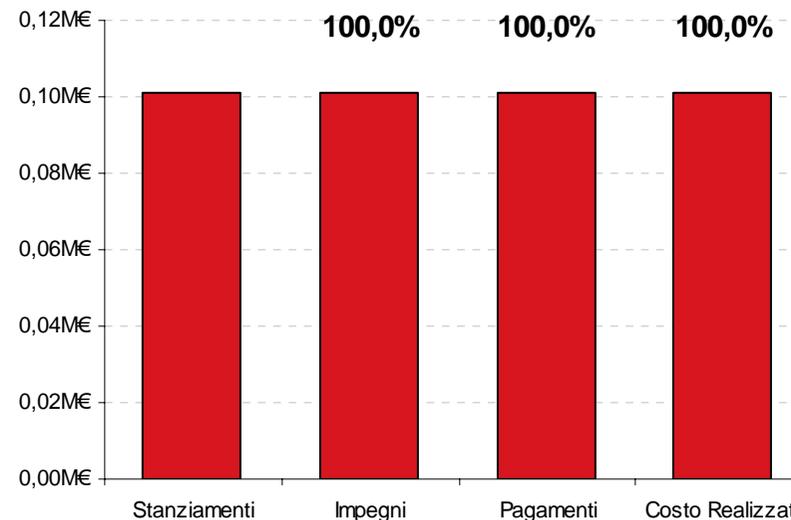

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

3 - SarBC2-02 - Realizzazione e allestimento Museo della Sardegna giudicale

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 8.000,00

% impegnato su stanziato: 0,8%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Relazione idea
progettuale

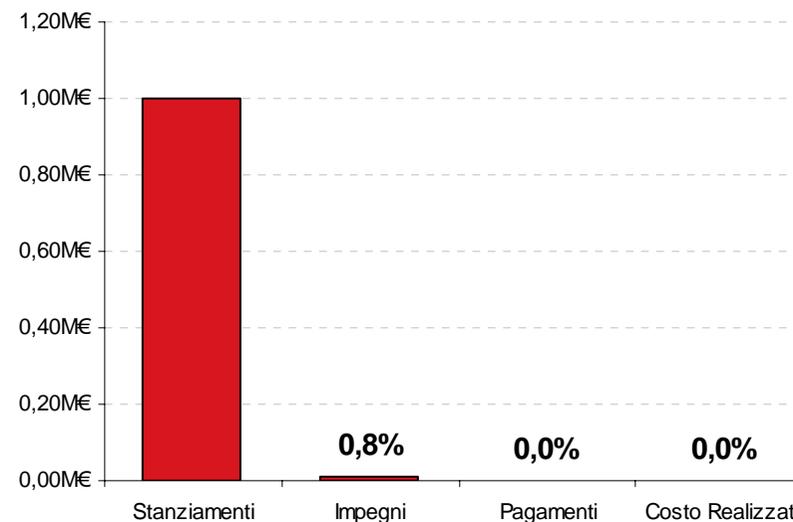

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

4 - SarBC2-03 - Realizzazione e allestimento Museo bonifiche e elettrificazione della Sardegna Villa Dolcetta – Arborea

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 8.000,00

% impegnato su stanziato: 0,8%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Definizione idea
progettuale

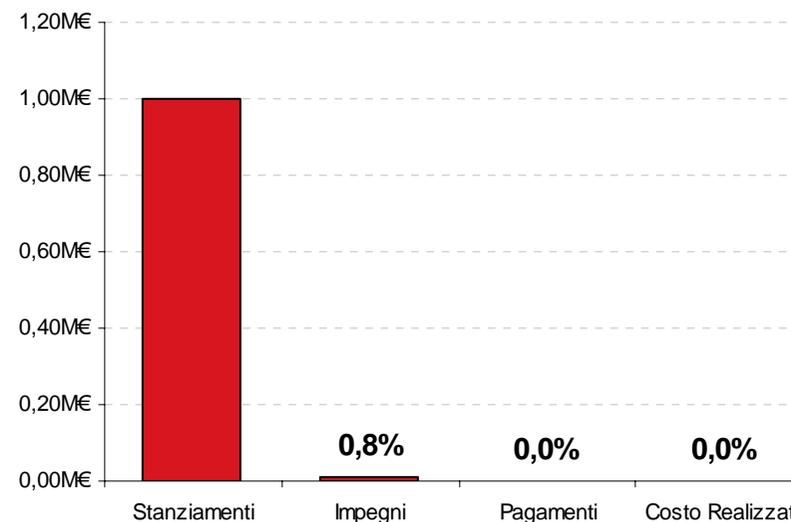

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

5 - SarBC2-04 - Realizzazione e allestimento del Museo del '900 e del contemporaneo

Somma stanziata: € 890.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progetto definit. ed
esecutivo

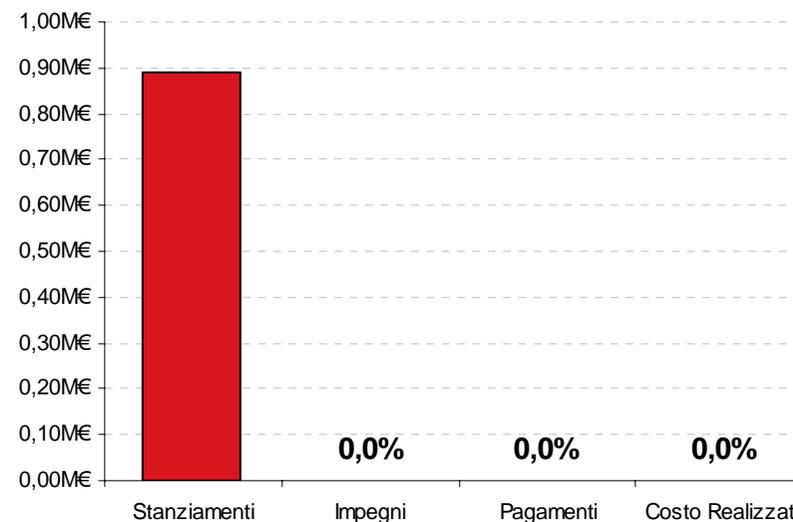

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

6 - SarBC2-05 - Valorizzazione Convento Gesuiti – Convitto Canopoleno – Sassari

Somma stanziata: € 168.624,42

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

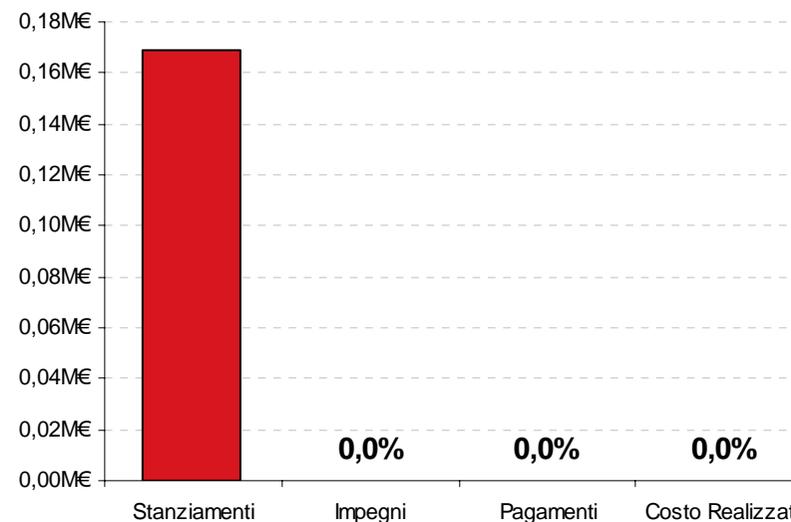

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

7 - SarBC2-06 - Potenziamento e valorizzazione delle collezioni permanenti del Museo Man di Nuoro

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 96.000,00

% impegnato su stanziato: 48%


Costo realizzato: € 96.000,00

% realizzato su stanziato: 48%

Pagamenti: € 96.000,00

% pagato su stanziato: 48%

Stato di attuazione: Appalto

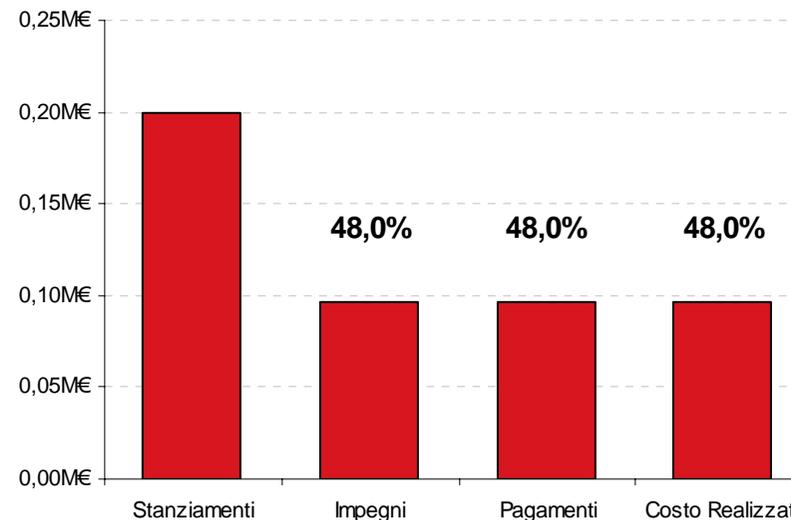

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

8 - SarBC-SF3b - Studio di fattibilità tramite concorso di idee del Museo delle Identità di Nuoro

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

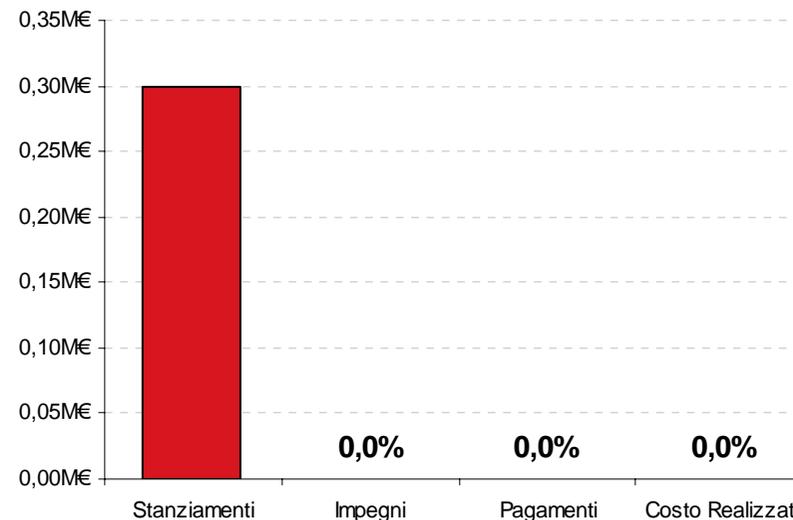

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

9 - SarBC2-07 - Museo archeologico nazionale e Pinacoteca nazionale. Integrazione strutturale

Somma stanziata: € 90.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

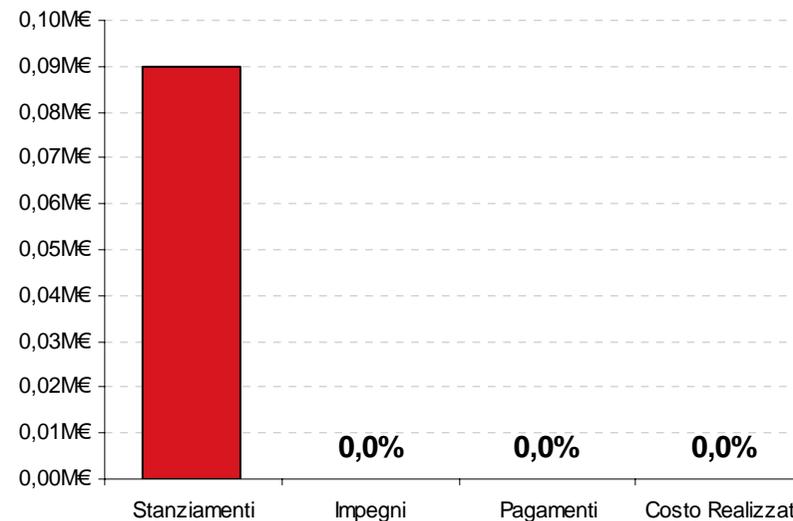

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

10 - SarBC2-08 - Pinacoteca nazionale. Allestimento

Somma stanziata: € 600.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

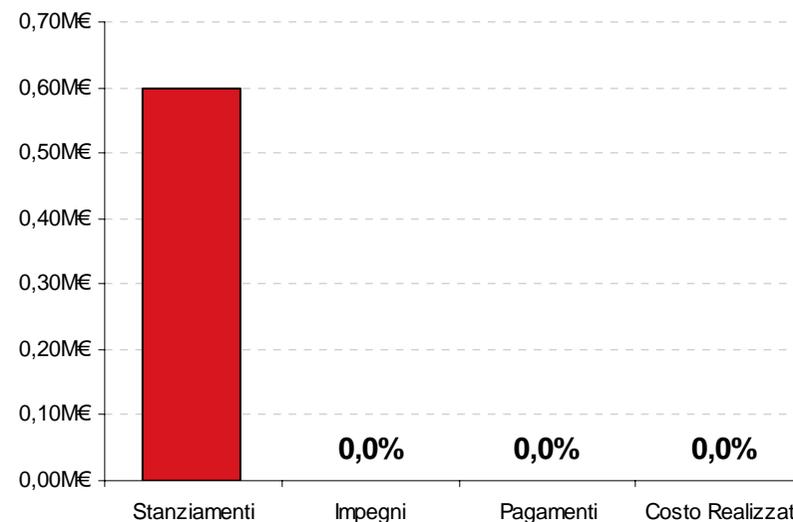

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

11 - SarBC2-09 - Museo archeologico nazionale storico: restauro e fruizione

Somma stanziata: € 600.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso per indisponibilità fondi MIBAC

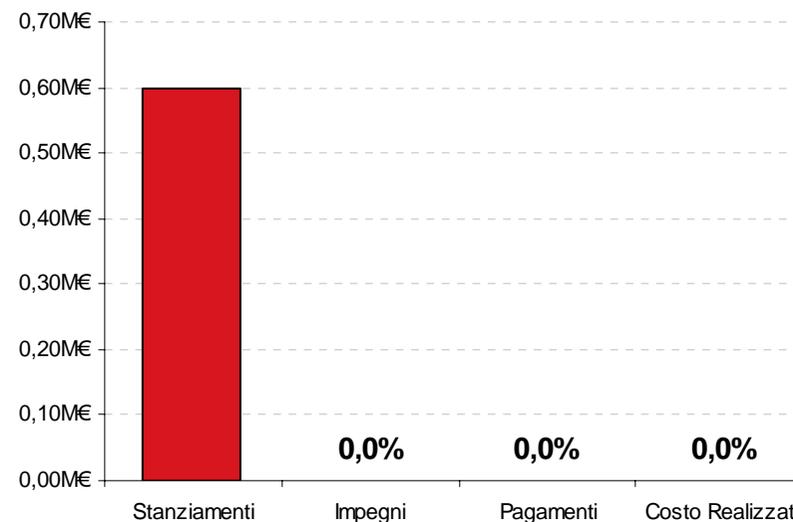

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

12 - SarBC2-10 - Le statue nuragiche di Monte Prama di Cabras

Somma stanziata: € 1.200.000,00

Somma impegnata: € 8.985,60

% impegnato su stanziato: 0,75%


Costo realizzato: € 8.985,60

% realizzato su stanziato: 0,75%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Predisposizione bando di gara

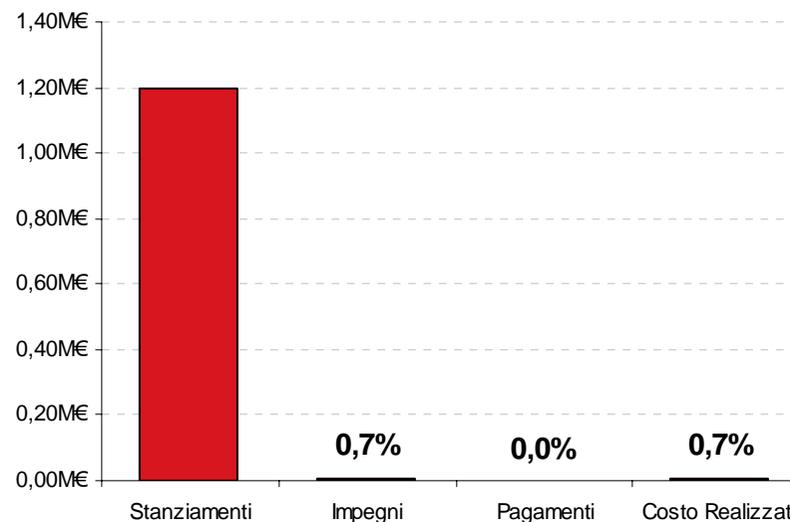

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

13 - SarBC2-11 - Restauro di cinque relitti del porto di Olbia

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 6.739,20

% impegnato su stanziato: 0,34%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

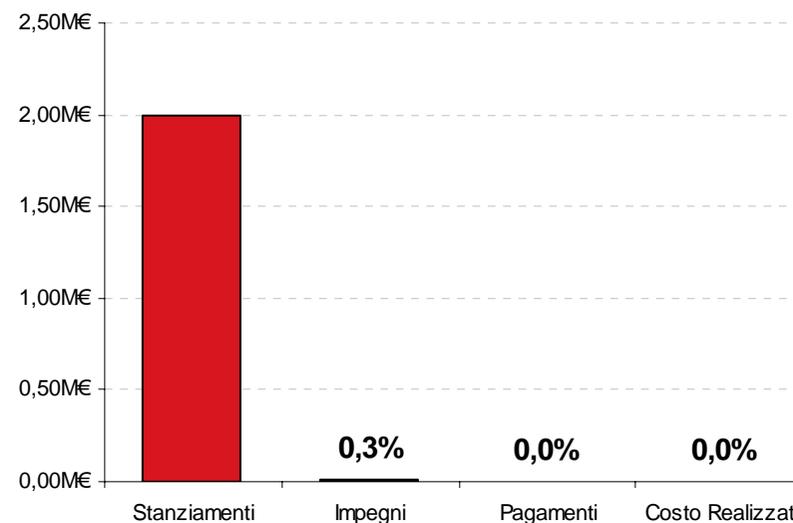

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

14 - SarBC2-13 - Recupero edificio "La Piccola" per il museo del porto

Somma stanziata: € 1.575.194,00

Somma impegnata: € 986.174,59

% impegnato su stanziato: 62,61%


Costo realizzato: € 255.649,89

% realizzato su stanziato: 16,23%

Pagamenti: € 255.649,89

% pagato su stanziato: 16,23%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

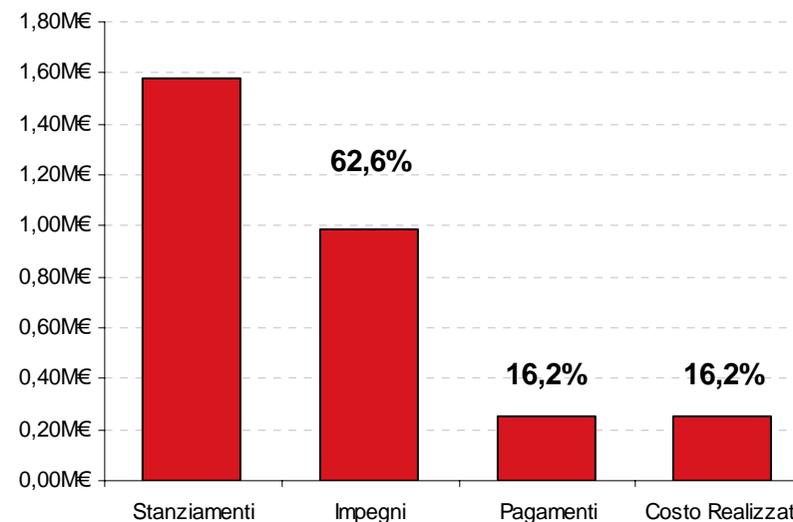

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

15 - SarBC 2-14 - Valorizzazione museale Montevercchio

Somma stanziata: € 1.972.865,00

Somma impegnata: € 1.972.865,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 1.850.052,45

% realizzato su stanziato: 93,77%

Pagamenti: € 1.850.052,45

% pagato su stanziato: 93,77%

Stato di attuazione: Collaudo

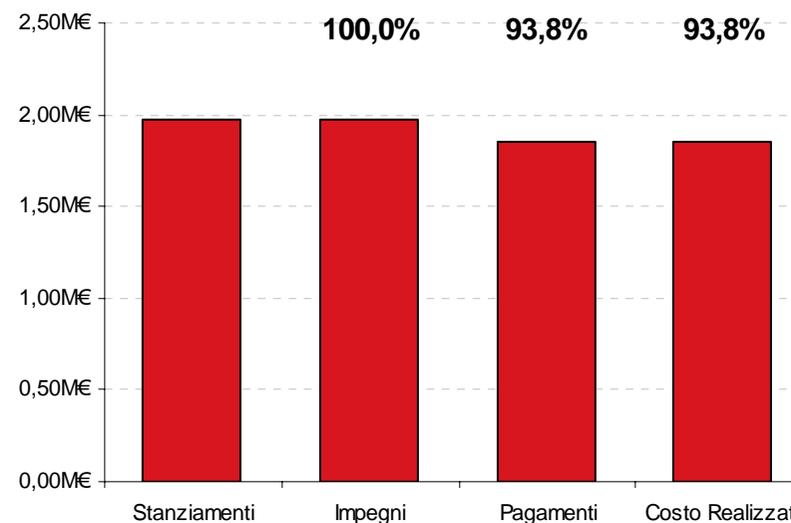

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

16 - SarBC2-15 - Restauro impianti minerari ex forge-miniera di Guspini

Somma stanziata: € 562.938,02

Somma impegnata: € 562.938,02

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 413.280,91

% realizzato su stanziato: 73,41%

Pagamenti: € 413.280,91

% pagato su stanziato: 73,41%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori

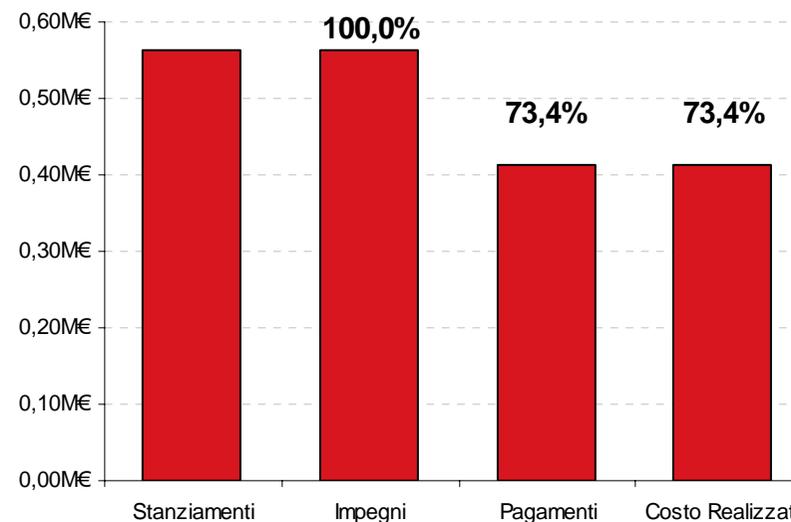

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

17 - SarBC2-16 - Metodologie per progettazione sostenibile paesaggio

Somma stanziata: € 130.000,00

Somma impegnata: € 115.000,00

% impegnato su stanziato: 88,46%


Costo realizzato: € 115.000,00

% realizzato su stanziato: 88,46%

Pagamenti: € 106.993,46

% pagato su stanziato: 82,3%

Stato di attuazione: Collaudo

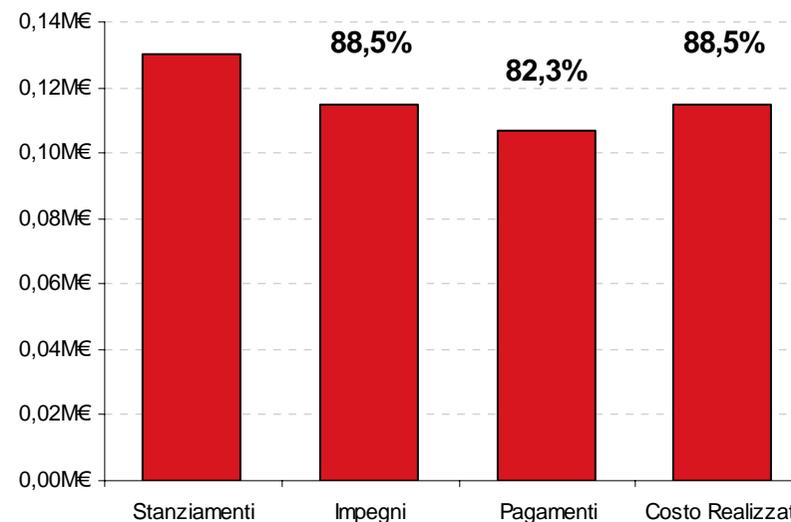

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

18 - SarBC2-17 - Concorso di idee per l'individuazione di tipologie edilizie costiere della Sardegna

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

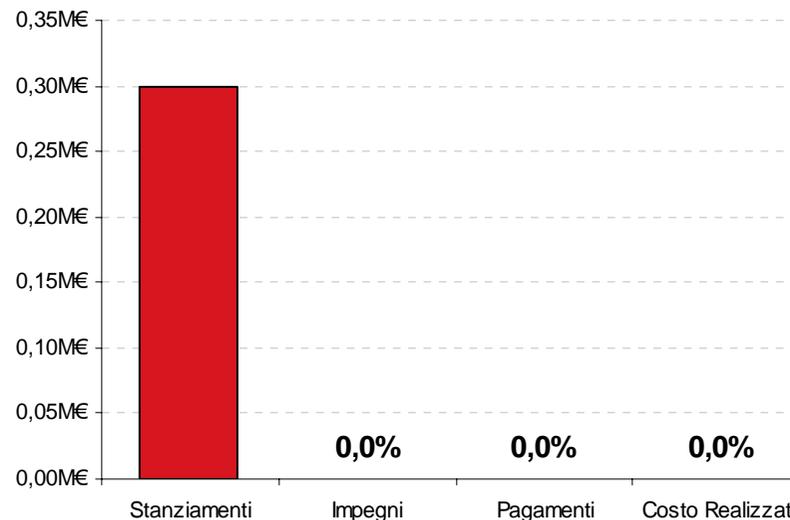

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

19 - SarBC3-18 - Centro di conservazione dei Beni Culturali - Laboratori aperti al pubblico - Sassari

Somma stanziata: € 3.000.000,00

Somma impegnata: € 20.541,68

% impegnato su stanziato: 0,68%


Costo realizzato: € 20.541,68

% realizzato su stanziato: 0,68%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

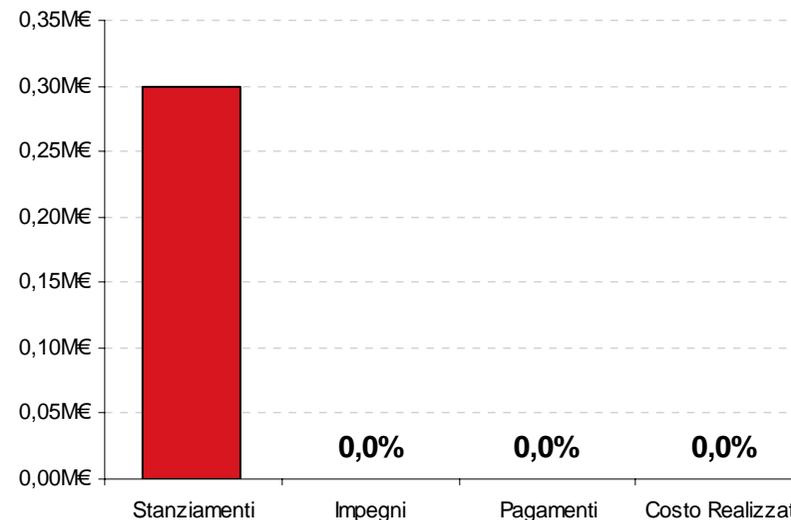

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

20 - SarBC3-19 - Scuola di alta formazione per restauratori. Impianto strutturale

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 11.739,20

% impegnato su stanziato: 1,17%


Costo realizzato: € 11.739,20

% realizzato su stanziato: 1,17%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

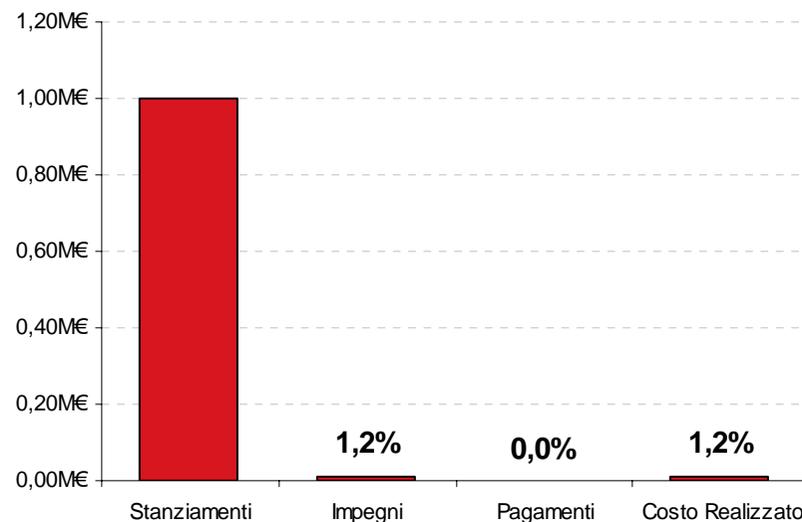

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

21 - SarBC-SF4b - Studio di fattibilità per la realizzazione della Fabbrica delle Arti e della Creatività del Mediterraneo

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto

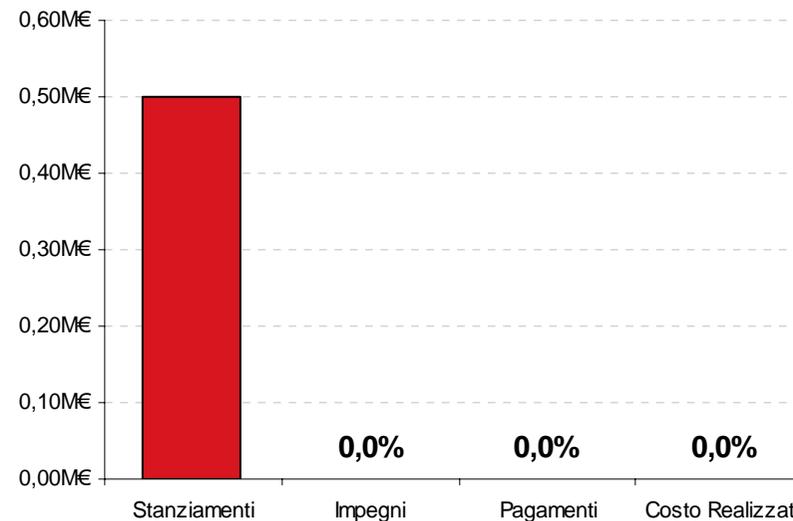

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

22 - SarBC4-21 - Biblioteca Universitaria di Cagliari. Allestimento funzionale nuova sede

Somma stanziata: € 1.455.378,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso per
indisponibilità fondi MIBAC

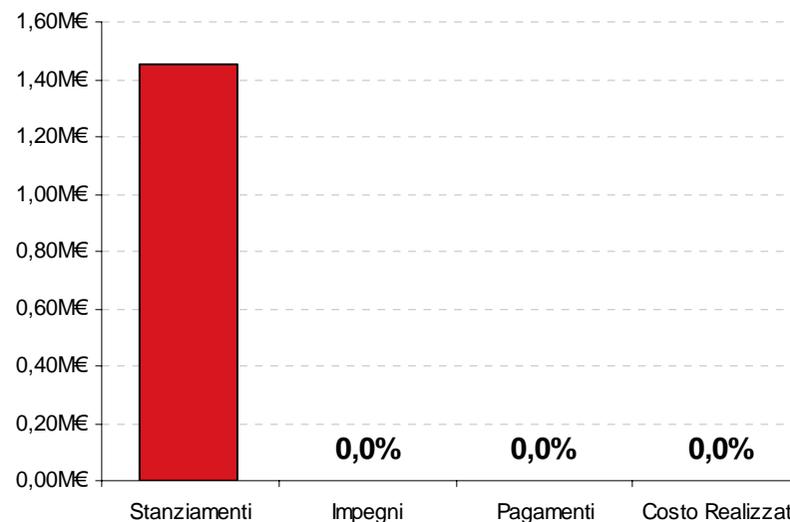

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

23 - SarBC4-22 - Archivi - deposito archeologici - Viale La Plaia - Cagliari. Ristrutturazione

Somma stanziata: € 750.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso per indisponibilità fondi MIBAC

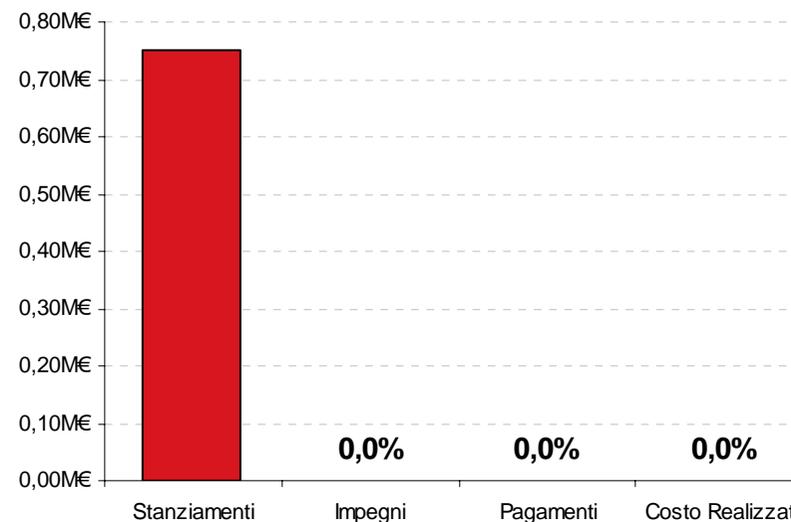

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

24 - SarBC4-23 - Archivi-deposito archeologici, viale La Plaia - Cagliari. Progettazione ampliamento

Somma stanziata: € 350.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appato

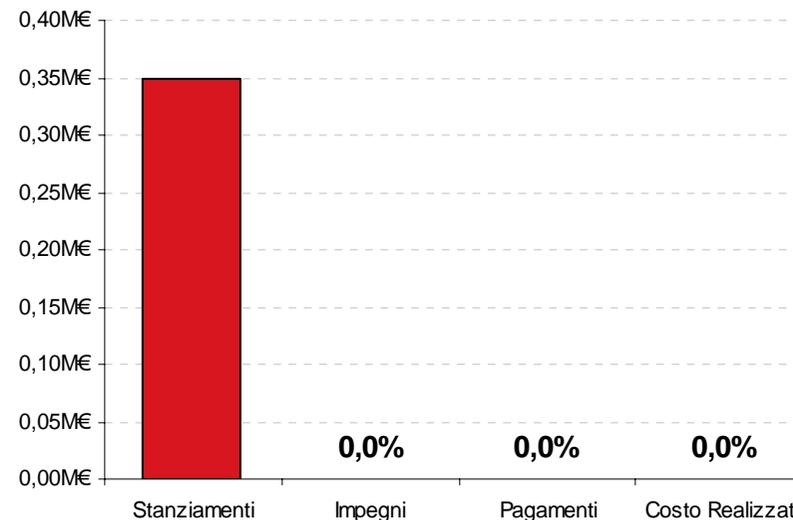

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

25 - SARBC4-24 - Recupero testimonianze storiche archivio audiovisivo RAI

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 133.333,32

% impegnato su stanziato: 66,67%


Costo realizzato: € 66.666,66

% realizzato su stanziato: 33,33%

Pagamenti: € 66.666,66

% pagato su stanziato: 33,33%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (33%)

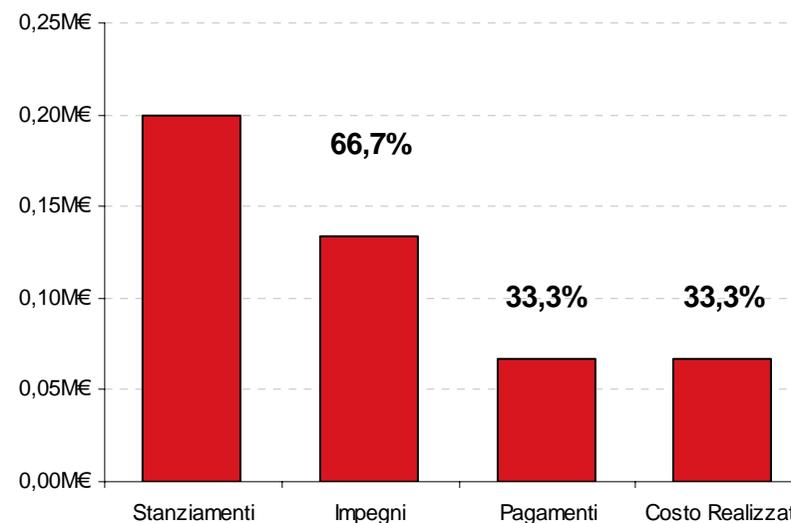

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

26 - SarBC4-25 - Catalogazione in SBN e riproduzione digitale dei frontespizi di materiale librario antico

Somma stanziata: € 520.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

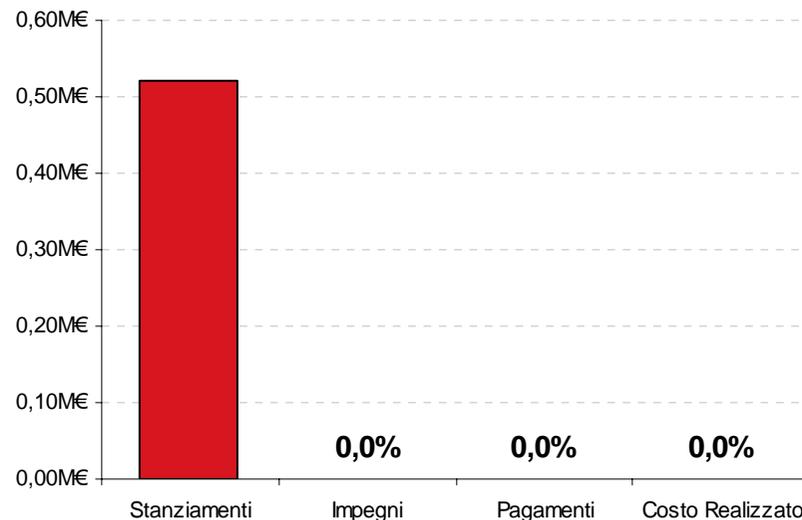

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

27 - SarBC4-26 - Ricognizione delle banche dati del patrimonio culturale della Sardegna. Adeguamento delle banche dati agli standard richiesti

Somma stanziata: € 156.000,00

Somma impegnata: € 142.000,00

% impegnato su stanziato: 91,03%


Costo realizzato: € 49.512,81

% realizzato su stanziato: 31,74%

Pagamenti: € 49.512,81

% pagato su stanziato: 31,74%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (31%)

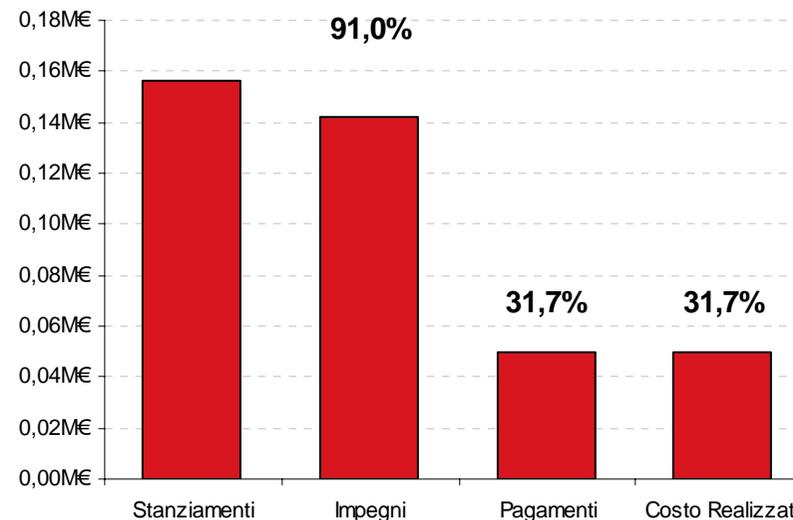

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

28 - SarBC4-27 - Digitalizzazione cartografia storica della Sardegna

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 199.342,74

% impegnato su stanziato: 66,45%


Costo realizzato: € 123.419,95

% realizzato su stanziato: 41,14%

Pagamenti: € 123.419,95

% pagato su stanziato: 41,14%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (41%)

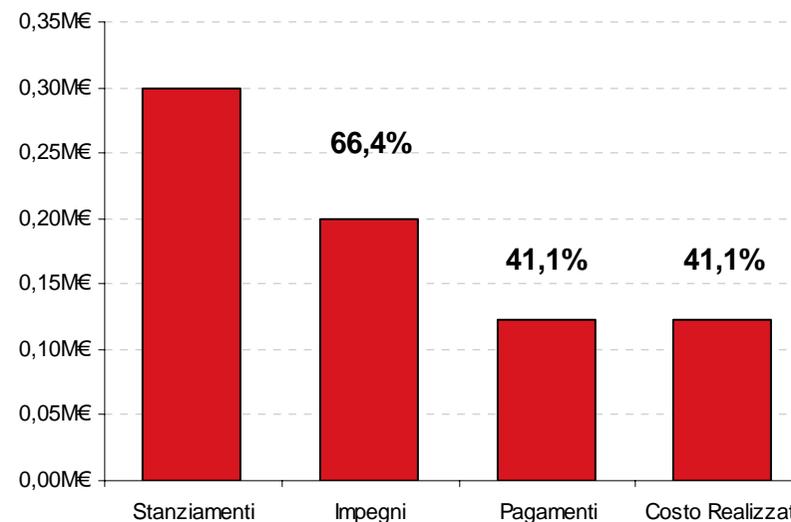

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

29 - SarBC4-28 - Polo tecnologico per i beni culturali. Strutture e servizi

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 479.187,03

% impegnato su stanziato: 95,84%


Costo realizzato: € 325.656,43

% realizzato su stanziato: 65,13%

Pagamenti: € 325.656,43

% pagato su stanziato: 65,13%

Stato di attuazione: Esecuzione lavori (65%)

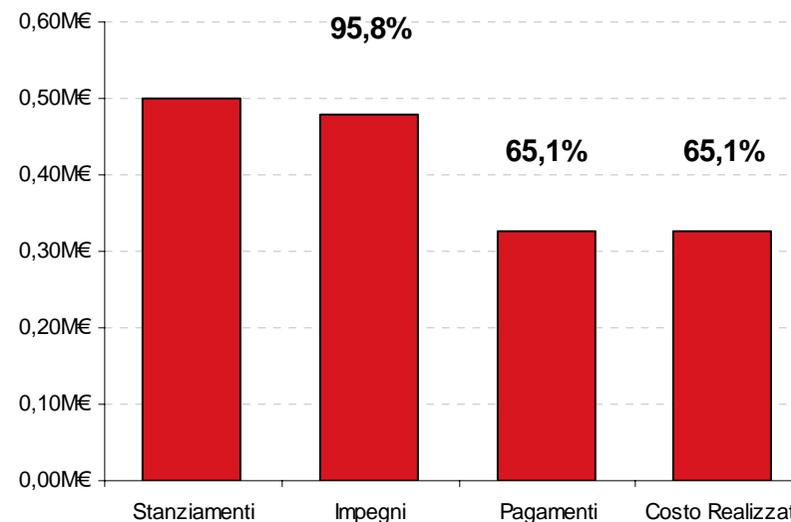

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

30 - SarBC4-29 - Sistema informativo georeferenziato

Somma stanziata: € 350.000,00

Somma impegnata: € 24.787,60

% impegnato su stanziato: 7,08%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

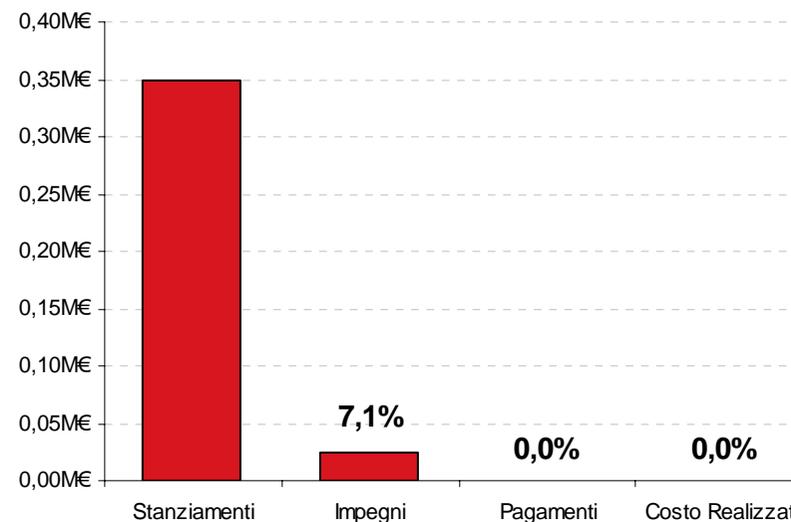

12 BENI CULTURALI

APQ ORIGINARIO 30 SETTEMBRE 2005

31 - SarBC-SF5 - Studio di fattibilità messa in rete e condivisione dei sistemi informativi sui Beni Culturali in Sardegna

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Studio di fattibilità

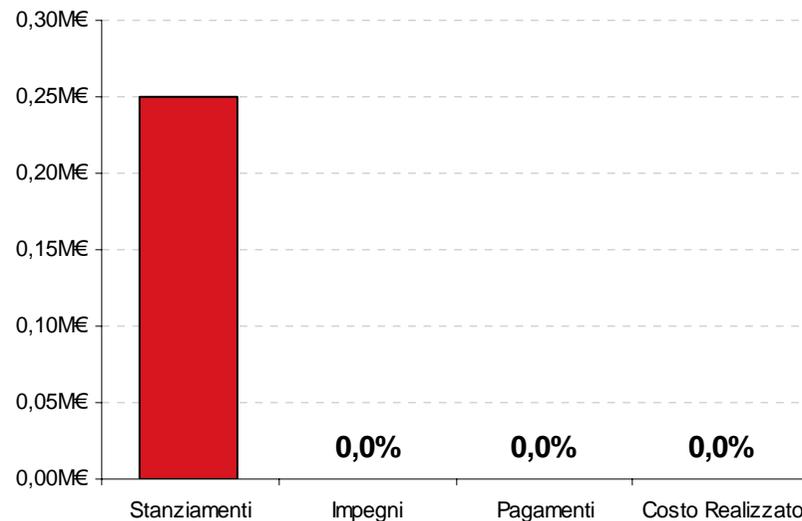

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

1 - SarBD-SF1 - Studio di fattibilità sistema bibliotecario urbano Cagliari

Somma stanziata: € 50.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

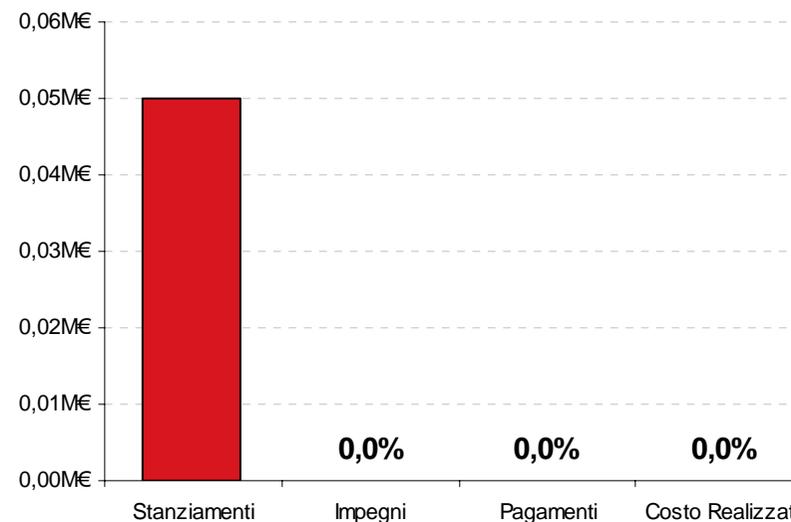

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

2 - SarBD-SF2 - Studio fattibilità per la realizzazione dell' Archivio Storico della Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari

Somma stanziata: € 50.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

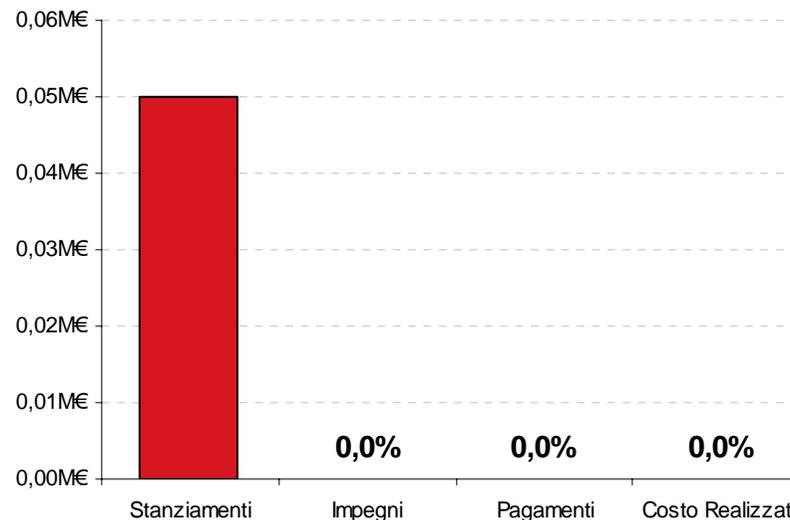

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

3 - SarBD-01 - Progettazione preliminare intero intervento, progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione 1° modulo funzionale Museo Regionale arte nuragica e arte contemporanea del Mediterraneo

Somma stanziata: € 33.099.200,00

Somma impegnata: € 199.368,48

% impegnato su stanziato: 0,6%


Costo realizzato: € 118.794,98

% realizzato su stanziato: 0,36%

Pagamenti: € 118.794,98

% pagato su stanziato: 0,36%

Stato di attuazione: Progetto preliminare

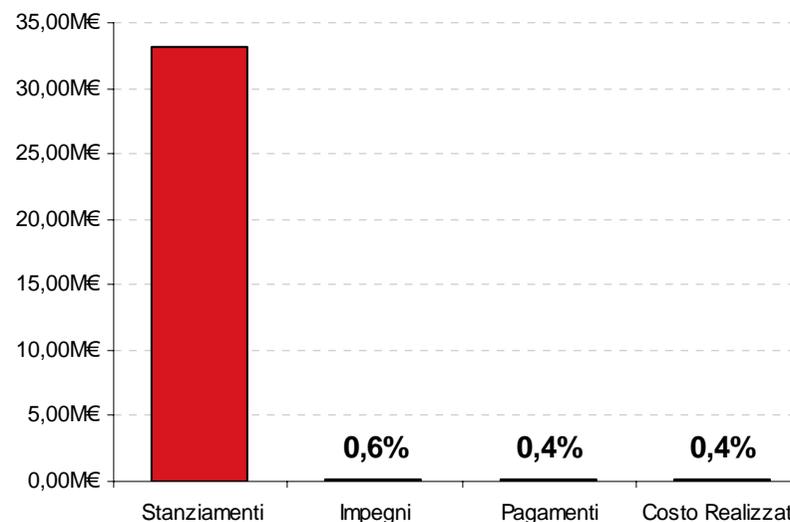

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

4 - SarBD-02 - Museo e laboratori delle Identità

Somma stanziata: € 9.330.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

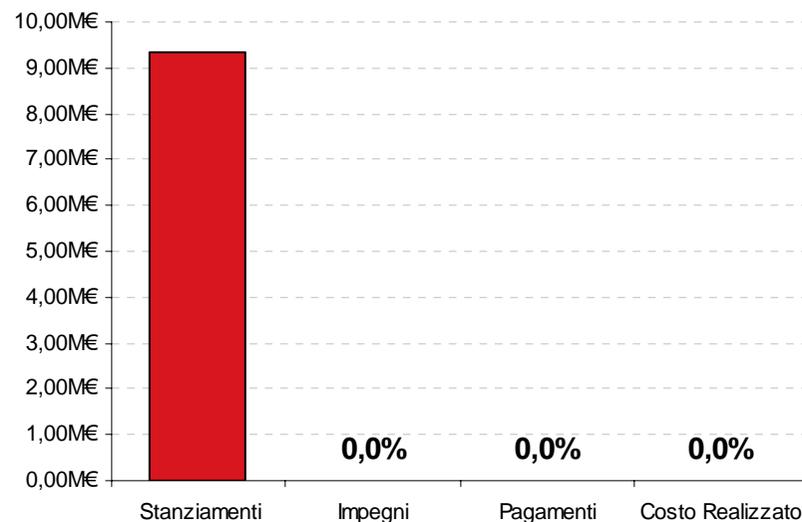

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

5 - SarBD-03 - Rete museale dei Fenici

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

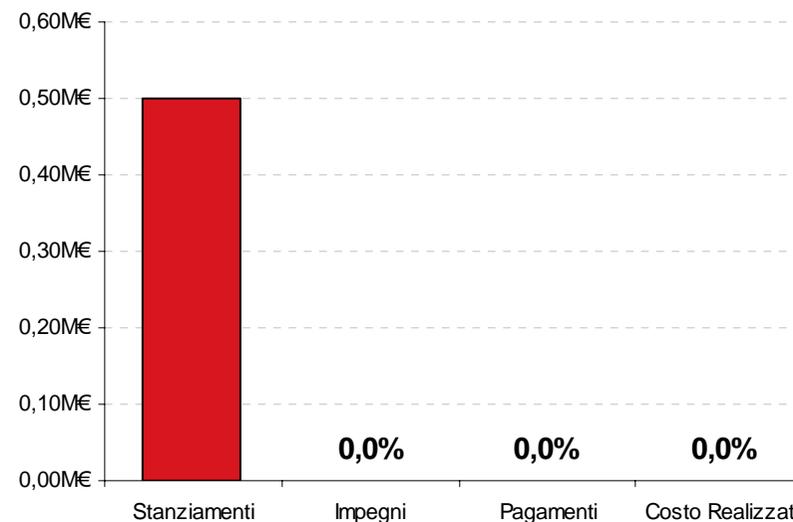

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

6 - SarBD-04 - Statue nuragiche di Monte Prama di Cabras. Documentazione, restauro e musealizzazione

Somma stanziata: € 400.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

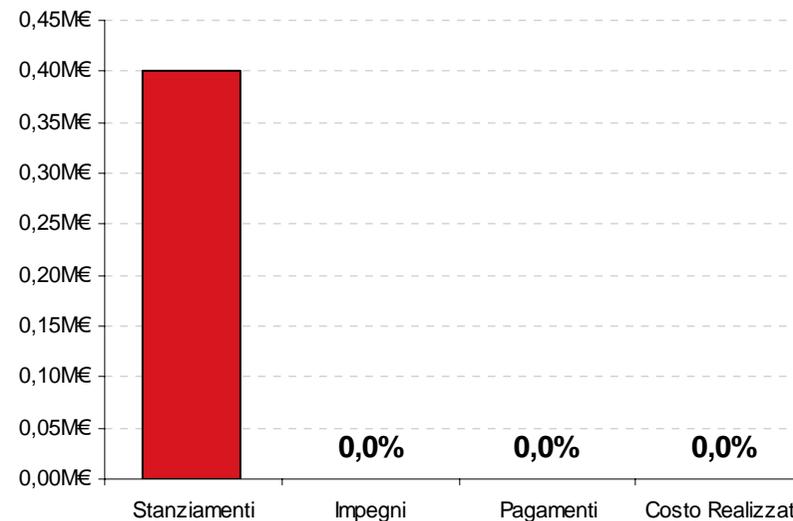

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

7 - SarBD-05 - Navi romane nel porto di Olbia

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

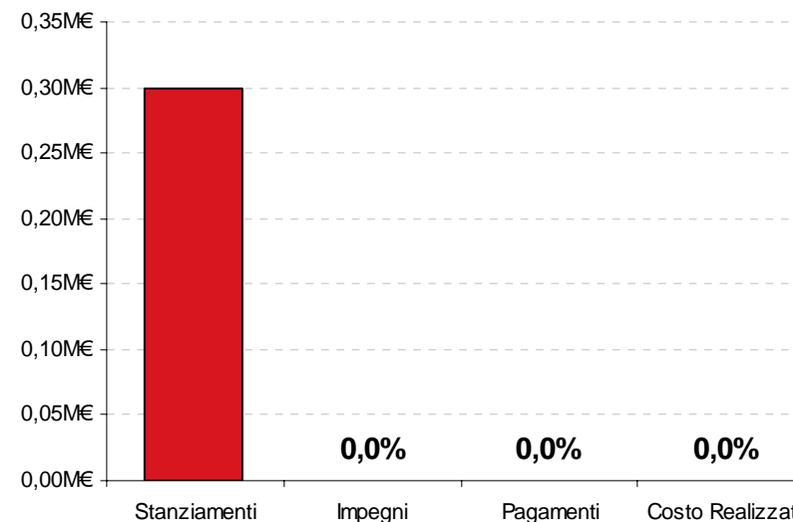

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

8 - SarBD-06 - Scuola regionale di alta formazione per restauro e conservazione del patrimonio culturale-istituzionale - Li Punti Sassari

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessuna attività

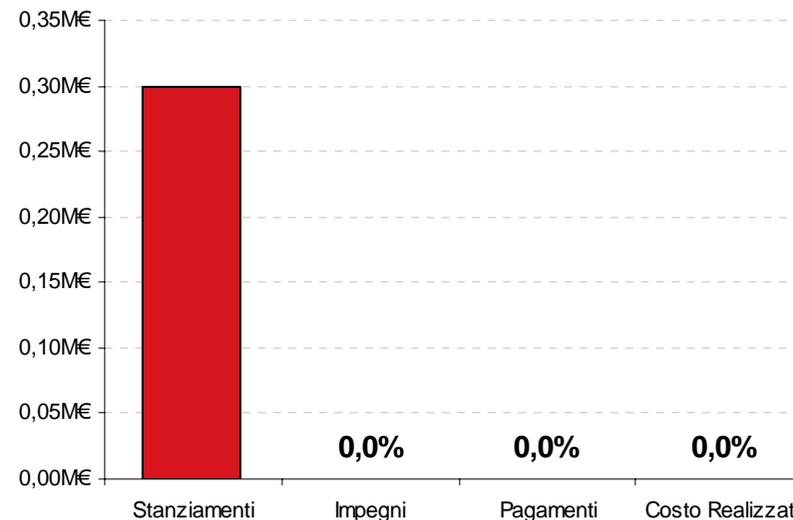

12.1 BENI CULTURALI

I ATTO INTEGRATIVO 02 OTTOBRE 2006

9 - SarBD-07 - Patrimonio archeologico subacqueo di Arbus e recupero di un galeone storico

Somma stanziata: € 150.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0,00

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione

