



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7 - APQ Difesa del Suolo

Assessorato Lavori Pubblici

Schede di sintesi per intervento al 31 dicembre 2006



**REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

Cagliari, febbraio 2007

7 - Difesa del Suolo

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

Indice

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
1	APQ Originario
1	1 - DF01 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada statale n. 126 tratto San Benedetto – Fluminimaggiore
2	2 - DF02 - Interventi per la riduzione del pericolo di movimenti franosi lungo la SP Villasalto - SS 384
3	3 - DF03 - Completamento sistemazione idraulica rio Santu Milanu a protezione della strada provinciale
4	4 - DF04 - Sistemazione idraulica del rio Gutturu-Flumini nell'abitato di Gonnese
5	5 - DF05 - Sistemazione idraulica rio Lanessi
6	6 - DF06 - Completamento sistemazione idraulica Rio Mannu - Pula
7	7 - DF07 - Rio Masoni Ollastu completamento sistemazione idraulica e rifacimento ponte SS 195
8	8 - DF08 - Opere di protezione per frana lungo la rete viaria provinciale
9	9 - DF09 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in Comune di Tresnuraghes
10	10 - DF10 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in comune di Sennariolo
11	11 - DF11 - Realizzazione di arginature lungo il fiume Tirso a protezione delle infrastrutture presenti in località Sili
12	12 - DF12 - Consolidamento del muro di sostegno della S.P. a ridosso dell'abitato di Nughedu S. Vittoria
13	13 - DF13 - Manutenzione alveo a protezione della viabilità comunale
14	14 - DF14 - Interventi di consolidamento aree soggette a frana lungo la SP Asuni-Nureci
15	15 - DF15 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-Oroli
16	16 - DF16 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-Perdasdefogu
17	17 - DF17 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la sp Talana-Villagrande
18	18 - DF18 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 129 in prossimità dell'abitato di Bosa
19	19 - DF19 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada ferrata delle Ferrovie Complementari in prossimità del centro di Bosa Marina
20	20 - DF20 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Nuoro-Oliena in prossimità dell'abitato di Nuoro
21	21 - DF21 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP e SC Nuoro-Monte Ortobene
22	22 - DF22 - Completamento consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 125 località Monte Tului



7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
23	23 - DF23 - Consolidamento dei versanti franosi a monte della SP Nuoro-Orgosolo in prossimità della strada ferrata
24	24 - DF24 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada Sologo-Lula-Bitti-Punta Crastatogliu
25	25 - DF25 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Lula-Sant'Anna
26	26 - DF26 - Consolidamento versanti in frana lungo il tracciato della SS 125 e delle strade comunali
27	27 - DF27 - Consolidamento area instabile adiacenti la strada comunale per Punta Pedra Longa
28	28 - DF28 - Versanti franosi lungo la strada statale 125
29	29 - DF29 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79
30	30 - DF30 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79
31	31 - DF31 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SP Bosa-Alghero (completamento)
32	32 - DF33 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 nel tratto compreso tra il pianoro di Campeda e il bivio di Bonorva
33	33 - DF34 - Opere di protezione dalla caduta di massi lungo la SS 131 in prossimità dello svincolo per Bonnanaro
34	34 - DF35 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 in prossimità della vallata del Mascari e la ferrovia
35	35 - DF37 - Consolidamento delle aree in frana lungo la strada di accesso all'abitato. Comune di Banari
36	36 - DF38 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di Castelsardo
37	37 - DF39 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di Sedini
38	38 - DF41 - Sistemazione del Rio Mannu in prossimità della SP18 e adeguamento attraversamenti
39	39 - DF42 - Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale e naturalistico dell'asta valliva del Flumendosa. Interventi sugli argini. Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Flumendosa nei comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu. 1 ^a fase, 1 ^o lotto, 1 ^o comparto
40	I Atto Integrativo
40	1 - DF43 - Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni. Progettazione generale e 1 ^o stralcio esecutivo
41	2 - DF44 - Fiume Posada. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga Maccheronis. Progettazione generale e 1 ^o stralcio esecutivo
42	3 - DF45 - Interventi di ricostituzione boschiva, consolidamento di versanti a rischio di erosione a ridosso dell'abitato del Comune di Villacidro
43	4 - DF46 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Flumendosa



7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

<i>Pag.</i>	<i>Intervento</i>
44	5 - DF47 - Studio di fattibilità interessante aree pubbliche per la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione e di recupero paesaggistico ed ambientale delle aree degradate dalle attività di cava nella Gallura (Comuni di Tempio Pausania, Luras, Calangianus, Luogosanto e Sant'Antonio di Gallura)
45	6 - DF48 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi necessari alla difesa delle coste e per la ridefinizione degli equilibri ambientali nelle aree a rischio di erosione nel settore nord-occidentale della Sardegna (Alghero, Sassari, Porto Torres, Castelsardo e Valledoria)
46	7 - DF49 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi prioritari di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica nel sub bacino n.7 – Flumendosa, Campidano, Cixerri del P.A.I.
47	8 - DF50 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi prioritari di riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Coghinas



7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

1 - DF01 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada statale n. 126 tratto San Benedetto – Fluminimaggiore

Somma stanziata: € 840.000,00

Somma impegnata: € 585.011,99

% impegnato su stanziato: 69,64%

Costo realizzato: € 203.077,62


% realizzato su stanziato: 24,18%

Pagamenti: € 203.077,42

% pagato su stanziato: 24,18%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

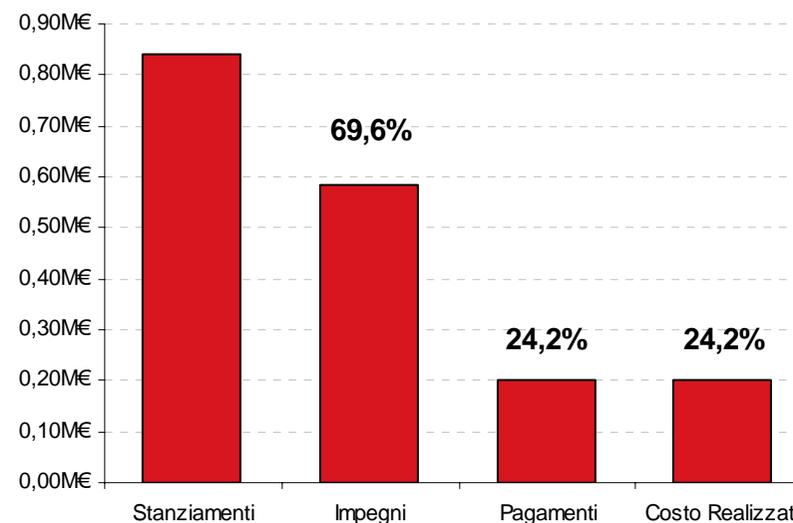

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

2 - DF02 - Interventi per la riduzione del pericolo di movimenti franosi lungo la SP Villasalto - SS 384

Somma stanziata: € 652.994,76

Somma impegnata: € 562.994,76

% impegnato su stanziato: 86,22%

Costo realizzato: € 148.860,62


% realizzato su stanziato: 22,8%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

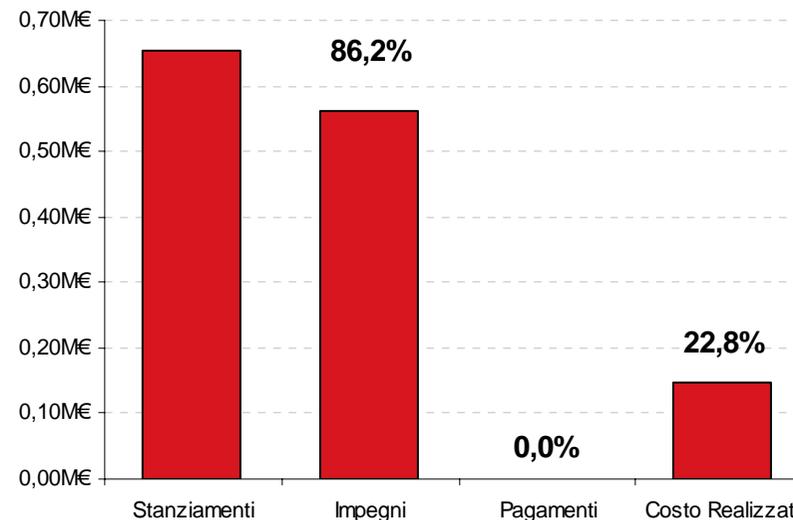

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

3 - DF03 - Completamento sistemazione idraulica rio Santu Milanu a protezione della strada provinciale

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 1.639.594,08

% impegnato su stanziato: 81,98%

Costo realizzato: € 168.589,47


% realizzato su stanziato: 8,43%

Pagamenti: € 168.589,47

% pagato su stanziato: 8,43%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

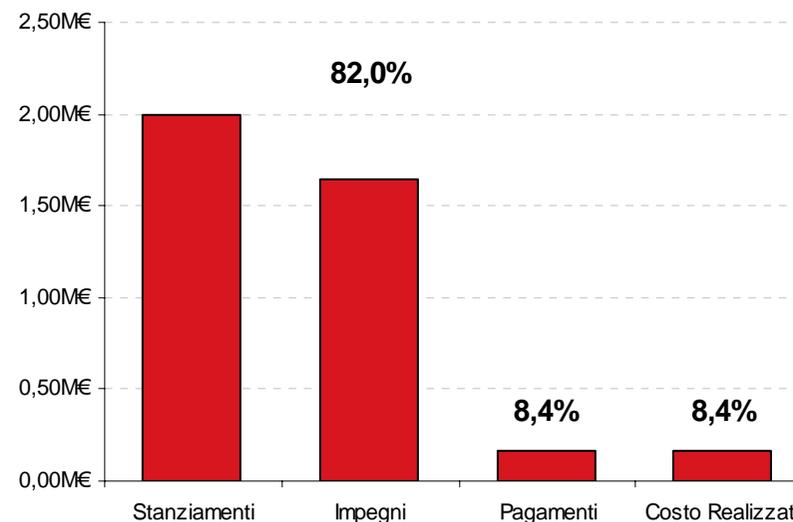

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

4 - DF04 - Sistemazione idraulica del rio Gutturu-Flumini nell'abitato di Gonnese

Somma stanziata: € 2.000.000,00

Somma impegnata: € 120.488,46

% impegnato su stanziato: 6,02%


Costo realizzato: € 120.488,46

% realizzato su stanziato: 6,02%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Progettazione in fase di ultimazione

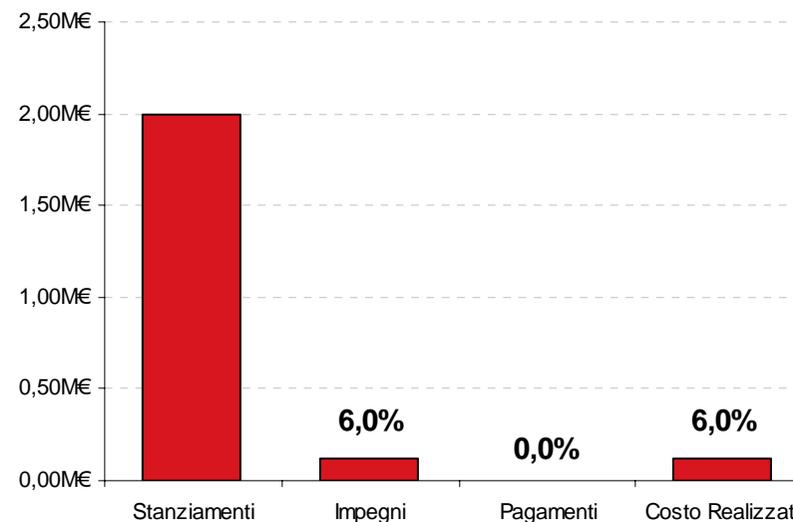

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

5 - DF05 - Sistemazione idraulica rio Lanessi - Comune di Segariu

Somma stanziata: € 1.136.109,16

Somma impegnata: € 1.100.366,14

% impegnato su stanziato: 96,85%


Costo realizzato: € 124.754,60

% realizzato su stanziato: 10,98%

Pagamenti: € 42.697,56

% pagato su stanziato: 3,76%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

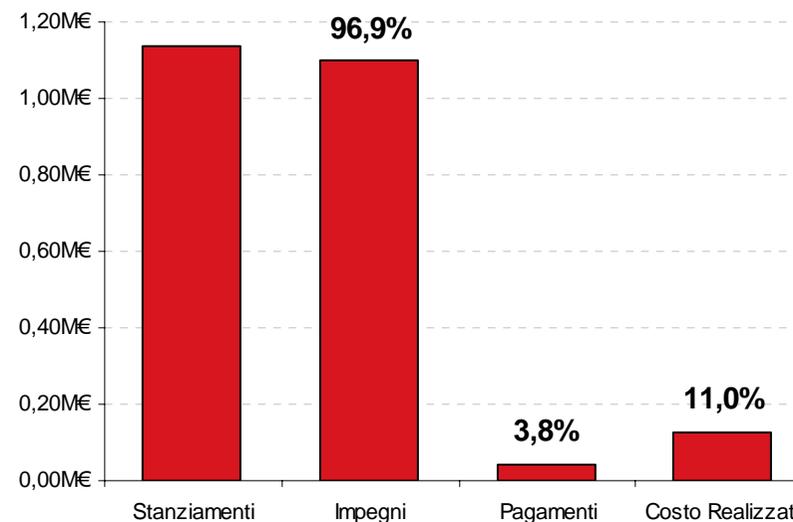

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

6 - DF06 - Completamento sistemazione idraulica Rio Mannu - Pula

Somma stanziata: € 1.500.000,00

Somma impegnata: € 1.218.925,17

% impegnato su stanziato: 81,26%

Costo realizzato: € 397.947,66


% realizzato su stanziato: 26,53%

Pagamenti: € 397.947,66

% pagato su stanziato: 26,53%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

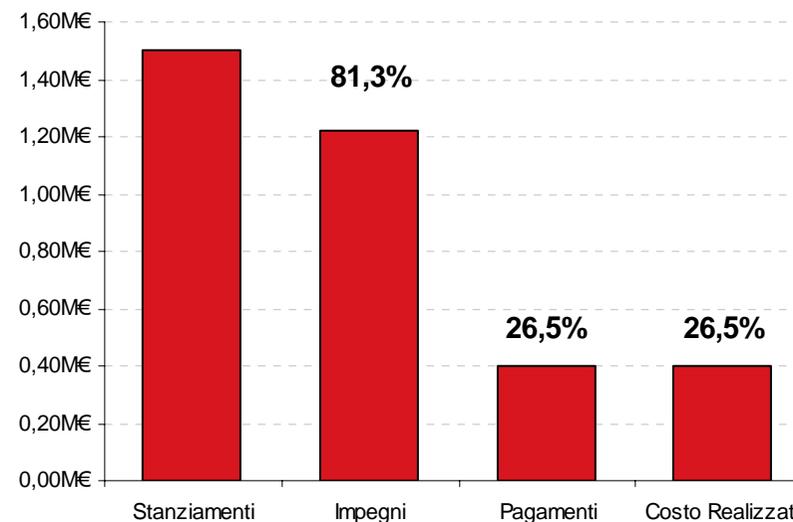

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

7 - DF07 - Rio Masoni Ollastu completamento sistema-zione idraulica e rifacimento ponte SS 195 - Comune di Capoterra

Somma stanziata: € 834.329,44

Somma impegnata: € 832.698,84

% impegnato su stanziato: 99,8%

Costo realizzato: € 262.268,95


% realizzato su stanziato: 31,43%

Pagamenti: € 262.268,95

% pagato su stanziato: 31,43%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

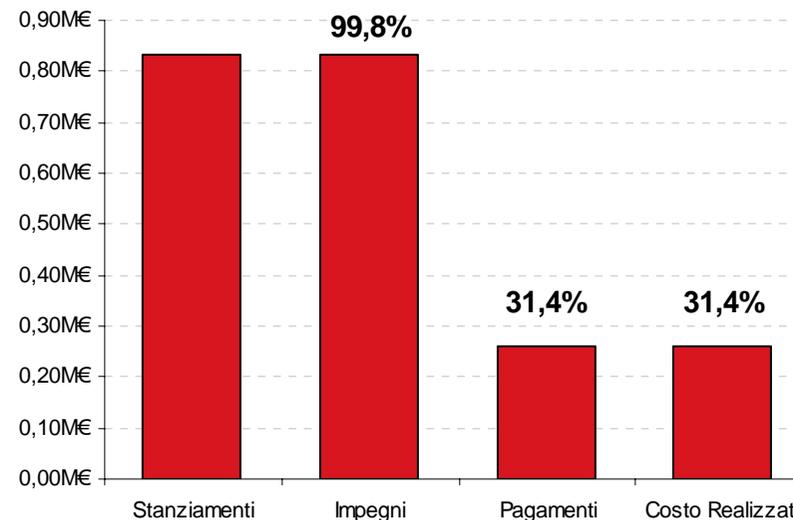

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

8 - DF08 - Opere di protezione per frana lungo la rete viaria provinciale (SP S'Arenarzu – Diga Santa Chiara e SP n. 74) – Provincia di Oristano

Somma stanziata: € 476.731,94

Somma impegnata: € 471.291,57

% impegnato su stanziato: 98,86%

Costo realizzato: € 458.790,14


% realizzato su stanziato: 96,24%

Pagamenti: € 8.790,14

% pagato su stanziato: 1,84%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

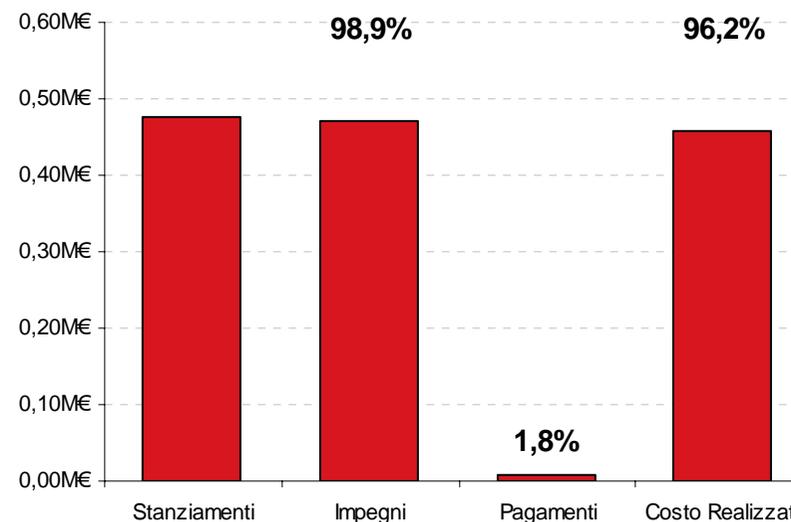

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

9 - DF09 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in Comune di Tresnuraghes

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 24.000,00

% impegnato su stanziato: 9,6%


Costo realizzato: € 20.000,00

% realizzato su stanziato: 8%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

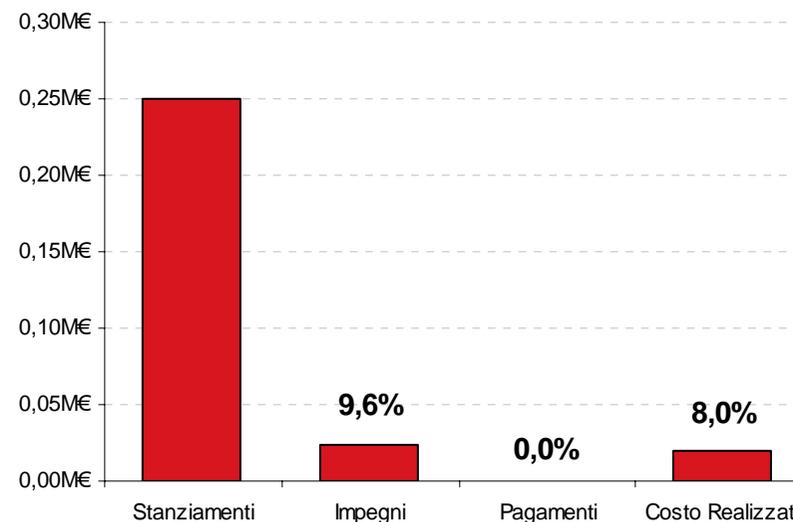

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

10 - DF10 - Opere per la riduzione del pericolo frane lungo la SS 292 in comune di Sennariolo

Somma stanziata: € 400.000,00

Somma impegnata: € 358.303,46

% impegnato su stanziato: 89,58%

Costo realizzato: € 141.091,78


% realizzato su stanziato: 35,27%

Pagamenti: € 141.091,78

% pagato su stanziato: 35,27%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

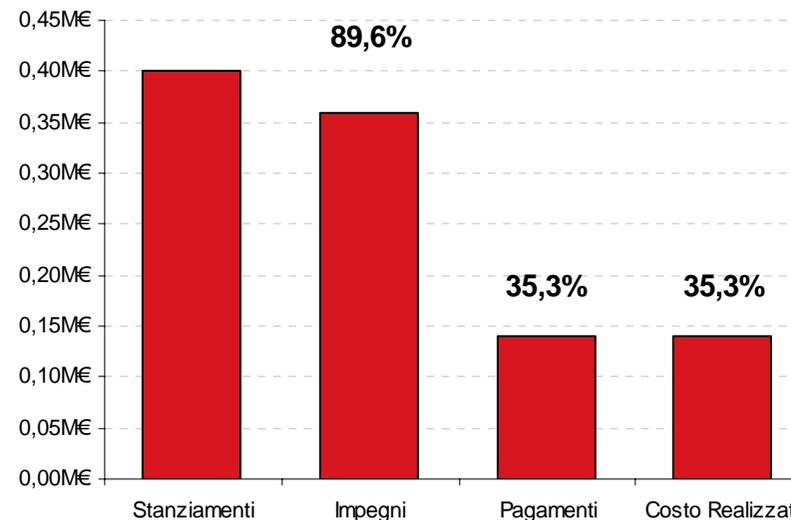

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

11 - DF11 - Realizzazione di arginature lungo il fiume Tirso a protezione delle infrastrutture presenti in località Sili

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 798.043,62

% impegnato su stanziato: 79,8%

Costo realizzato: € 357.539,82


% realizzato su stanziato: 35,75%

Pagamenti: € 327.619,84

% pagato su stanziato: 32,76%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

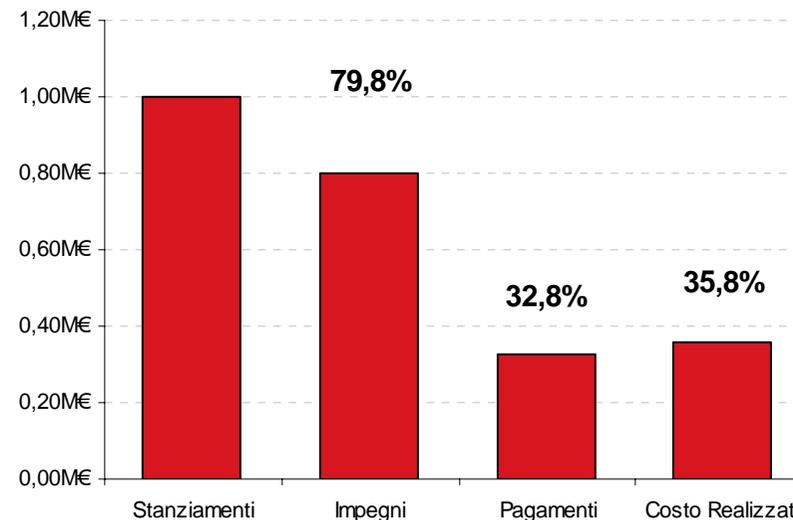

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

12 - DF12 - Consolidamento del muro di sostegno della S.P. a ridosso dell'abitato di Nughedu S. Vittoria

Somma stanziata: € 217.240,00

Somma impegnata: € 36.860,46

% impegnato su stanziato: 16,97%


Costo realizzato: € 20.271,37

% realizzato su stanziato: 9,33%

Pagamenti: € 20.271,37

% pagato su stanziato: 9,33%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

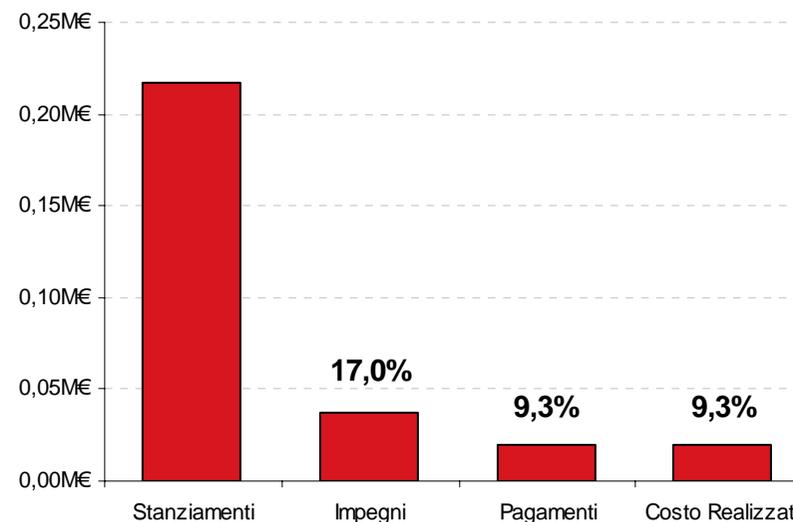

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

13 - DF13 - Manutenzione alveo a protezione della viabilità comunale – Comune di Milis

Somma stanziata: € 121.697,89

Somma impegnata: € 118.681,89

% impegnato su stanziato: 97,52%

Costo realizzato: € 117.041,19


% realizzato su stanziato: 96,17%

Pagamenti: € 117.041,19

% pagato su stanziato: 96,17%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

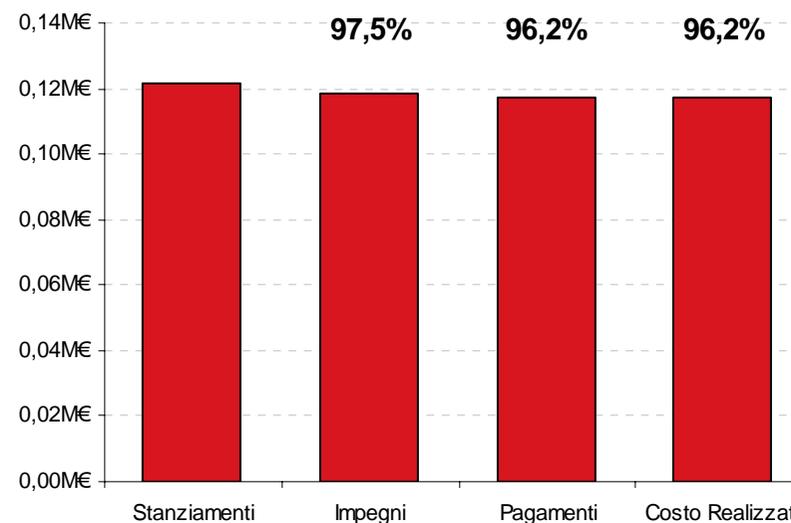

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

14 - DF14 - Interventi di consolidamento aree soggette a frana lungo la SP Asuni-Nureci

Somma stanziata: € 453.080,12

Somma impegnata: € 392.867,38

% impegnato su stanziato: 86,71%

Costo realizzato: € 65.571,24


% realizzato su stanziato: 14,47%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

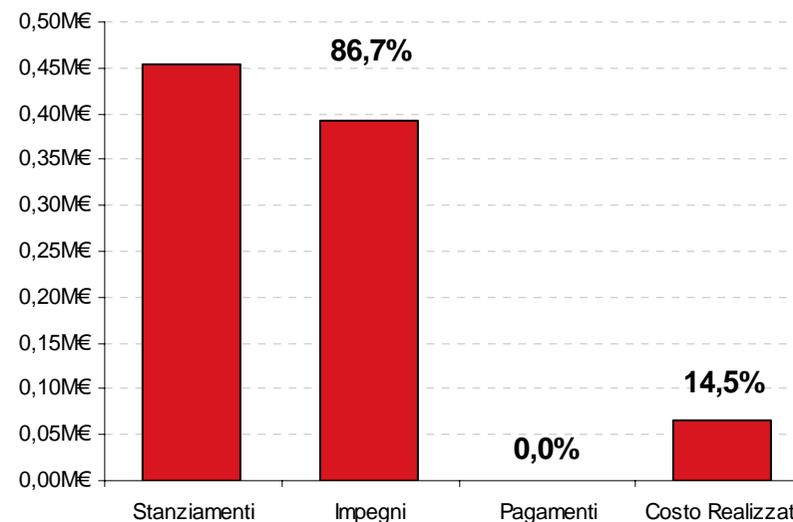

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

15 - DF15 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-Orroli

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Fase di avanzamento lavori

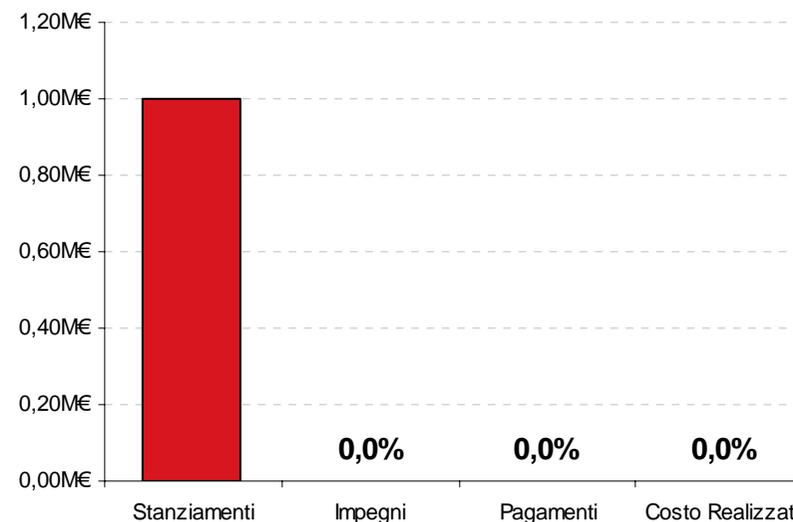

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

16 - DF16 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada provinciale Escalaplano-Perdasdefogu

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Fase di avanzamento lavori

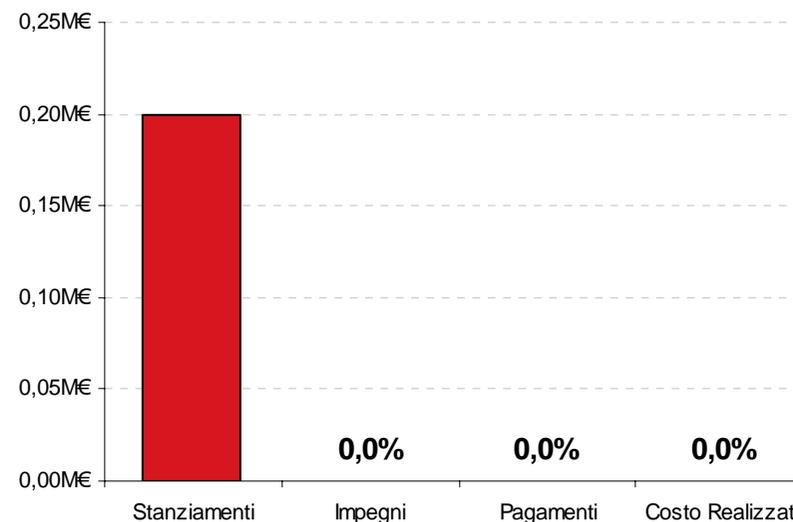

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

17 - DF17 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la S.P. Talana-Villagrande

Somma stanziata: € 700.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

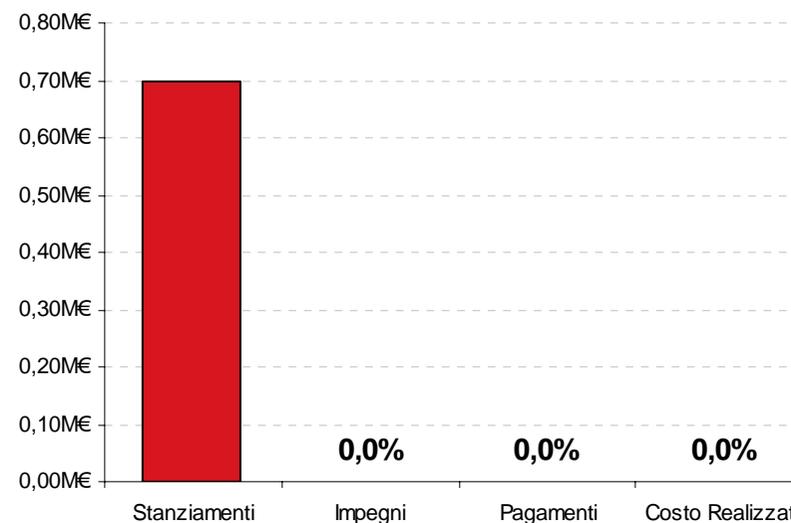

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

18 - DF18 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 129 in prossimità dell'abitato di Bosa

Somma stanziata: € 341.173,44

Somma impegnata: € 300.034,63

% impegnato su stanziato: 87,94%

Costo realizzato: € 110.000,00


% realizzato su stanziato: 32,24%

Pagamenti: € 42.847,43

% pagato su stanziato: 12,56%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

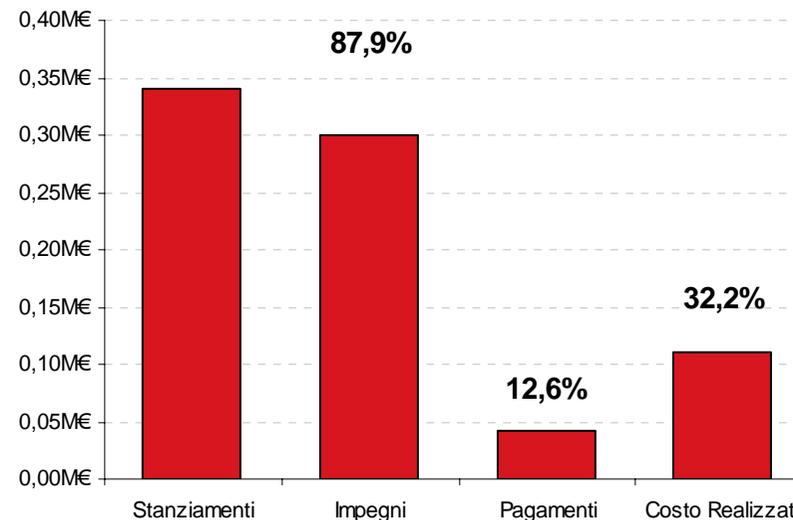

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

19 - DF19 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada ferrata delle Ferrovie Complementari in prossimità del centro di Bosa Marina

Somma stanziata: € 883.414,49

Somma impegnata: € 829.567,19

% impegnato su stanziato: 93,9%

Costo realizzato: € 254.864,13


% realizzato su stanziato: 28,85%

Pagamenti: € 244.864,13

% pagato su stanziato: 27,72%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

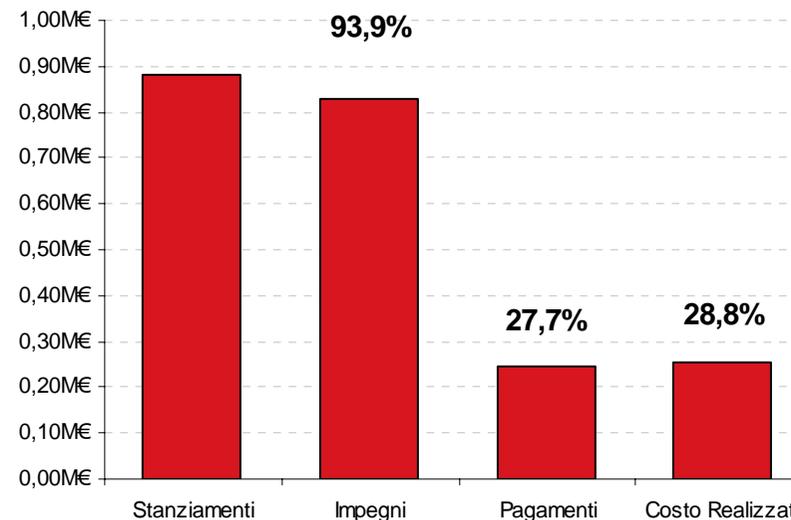

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

20 - DF20 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Nuoro-Oliena in prossimità dell'abitato di Nuoro

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione:

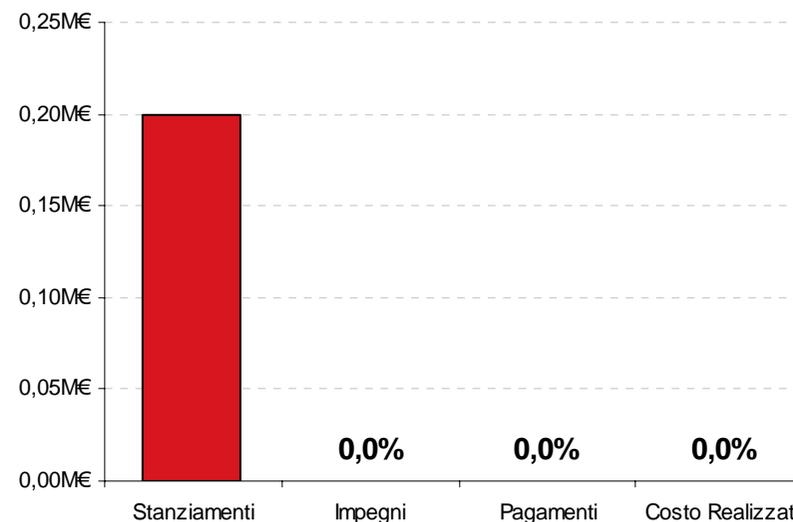

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

21 - DF21 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP e SC Nuoro-Monte Ortobene

Somma stanziata: € 1.000.000,00

Somma impegnata: € 1.000.000,00

% impegnato su stanziato: 100%


Costo realizzato: € 89.971,47

% realizzato su stanziato: 9%

Pagamenti: € 89.971,47

% pagato su stanziato: 9%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

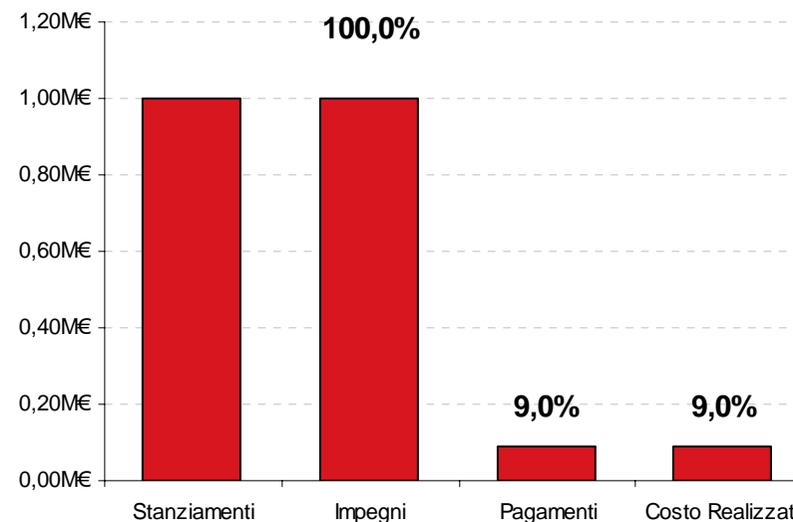

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

22 - DF22 - Completamento consolidamento dei versanti franosi lungo la SS 125 località Monte Tului – Comune di Dorgali

Somma stanziata: € 566.514,46

Somma impegnata: € 519.777,65

% impegnato su stanziato: 91,75%

Costo realizzato: € 94.844,62


% realizzato su stanziato: 16,74%

Pagamenti: € 94.844,62

% pagato su stanziato: 16,74%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

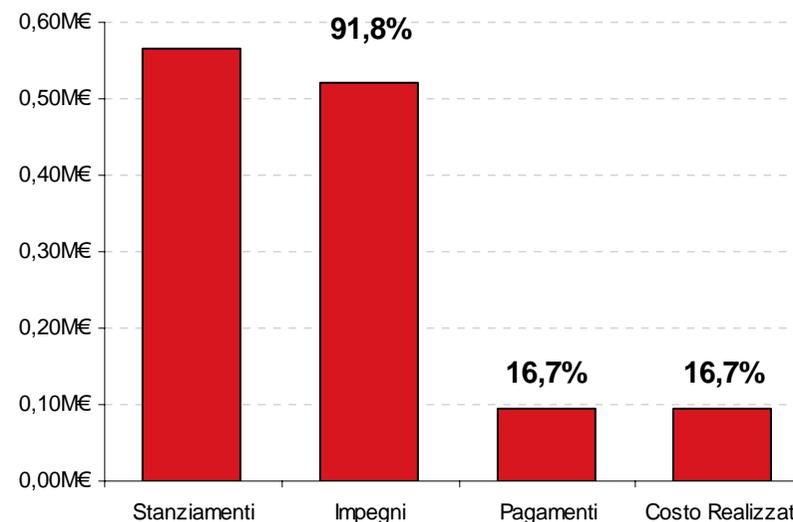

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

23 - DF23 - Consolidamento dei versanti franosi a monte della SP Nuoro-Orgosolo in prossimità della strada ferrata

Somma stanziata: € 150.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0


% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

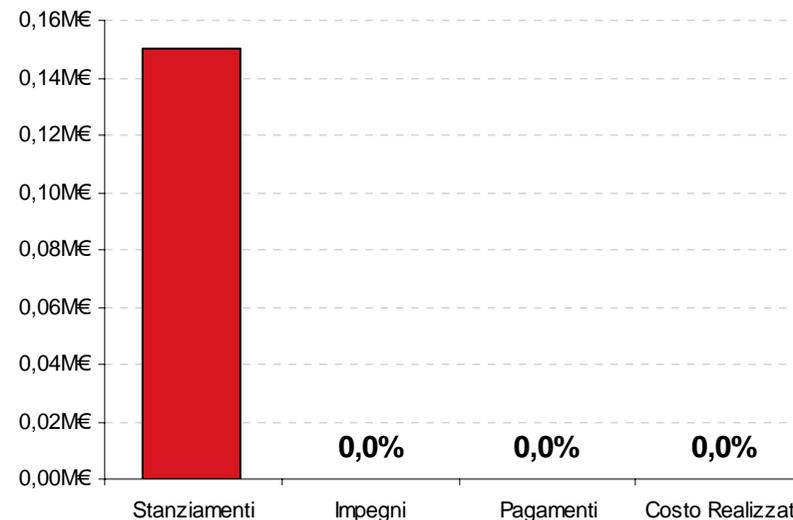

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

24 - DF24 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la strada Sologo-Lula-Bitti-Punta Crastatogliu

Somma stanziata: € 250.000,00

Somma impegnata: € 245.939,71

% impegnato su stanziato: 98,38%

Costo realizzato: € 87.500,00


% realizzato su stanziato: 35%

Pagamenti: € 87.500,00

% pagato su stanziato: 35%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

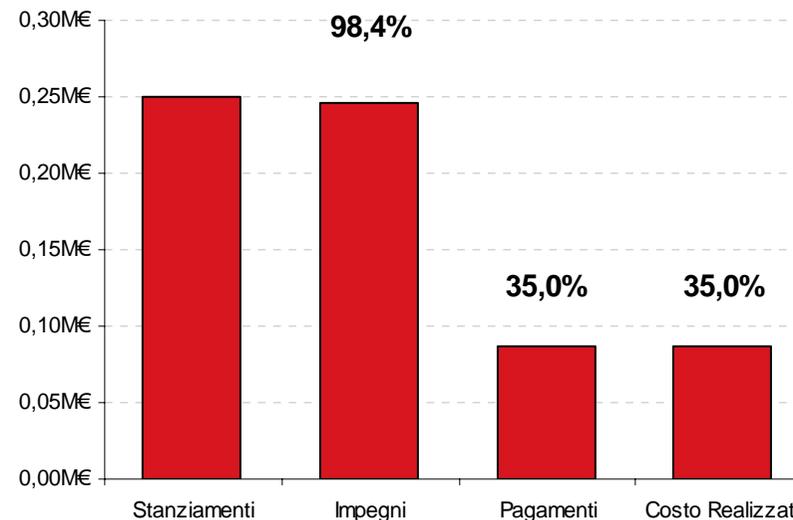

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

25 - DF25 - Consolidamento dei versanti franosi lungo la SP Lula-Sant'Anna

Somma stanziata: € 550.000,00

Somma impegnata: € 460.755,20

% impegnato su stanziato: 83,77%

Costo realizzato: € 330.319,19


% realizzato su stanziato: 60,06%

Pagamenti: € 330.318,77

% pagato su stanziato: 60,06%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

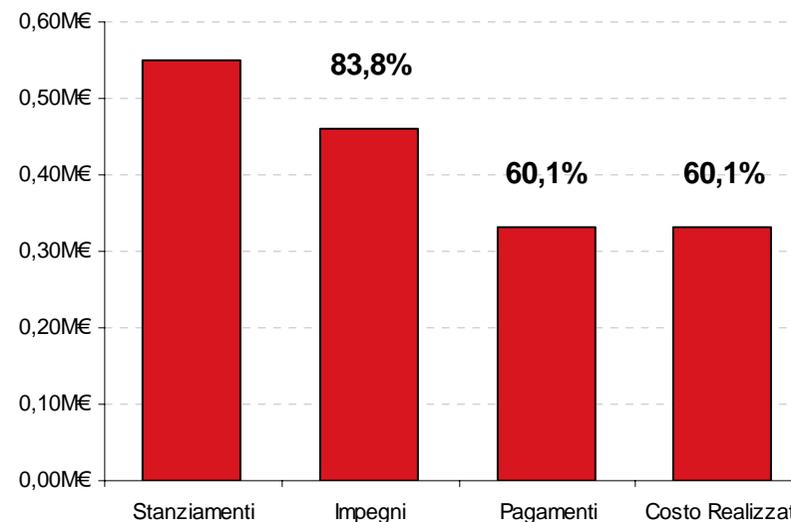

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

26 - DF26 - Consolidamento versanti in frana lungo il tracciato della SS 125 e delle strade comunali

Somma stanziata: € 400.000,00

Somma impegnata: € 370.518,38

% impegnato su stanziato: 92,63%

Costo realizzato: € 83.231,69


% realizzato su stanziato: 20,81%

Pagamenti: € 19.874,81

% pagato su stanziato: 4,97%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

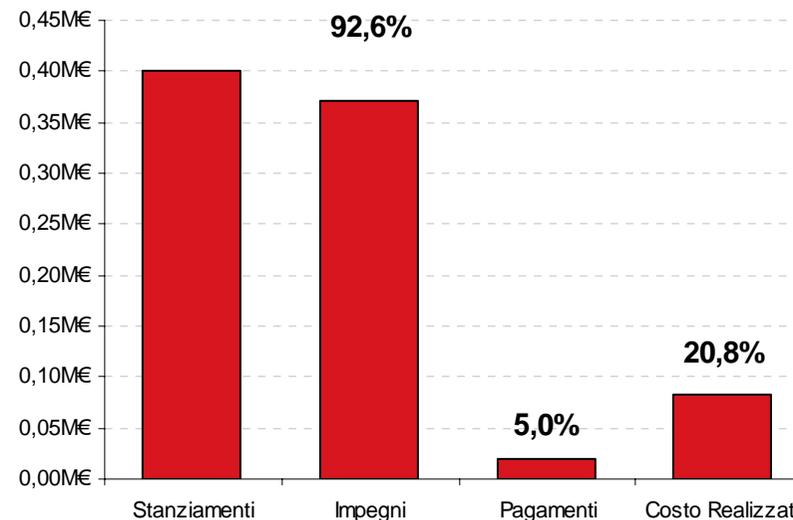

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

27 - DF27 - Consolidamento area instabile adiacenti la strada comunale per Punta Pedra Longa - Comune di Baunei

Somma stanziata: € 635.291,20

Somma impegnata: € 619.169,20

% impegnato su stanziato: 97,46%

Costo realizzato: € 315.659,34


% realizzato su stanziato: 49,69%

Pagamenti: € 315.659,34

% pagato su stanziato: 49,69%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

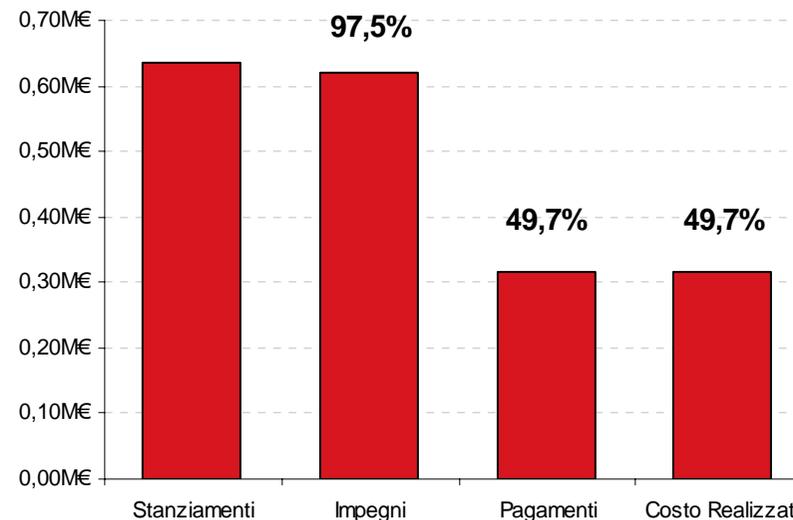

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

28 - DF28 - Versanti franosi lungo la strada statale 125 – Comune di Barisardo

Somma stanziata: € 83.617,85

Somma impegnata: € 83.617,85

% impegnato su stanziato: 100%

Costo realizzato: € 83.617,85


% realizzato su stanziato: 100%

Pagamenti: € 76.933,66

% pagato su stanziato: 92,01%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

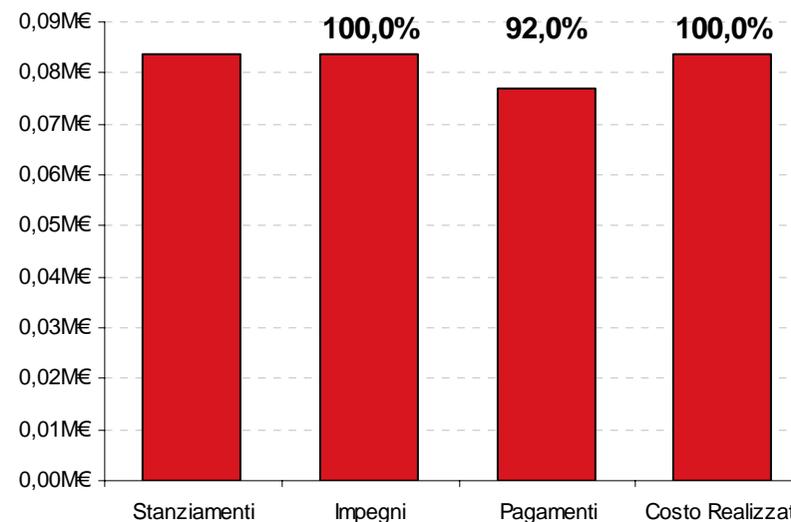

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

29 - DF29 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79 – Comune di Gairo

Somma stanziata: € 404.977,18

Somma impegnata: € 386.895,18

% impegnato su stanziato: 95,54%

Costo realizzato: € 304.472,65


% realizzato su stanziato: 75,18%

Pagamenti: € 304.472,65

% pagato su stanziato: 75,18%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

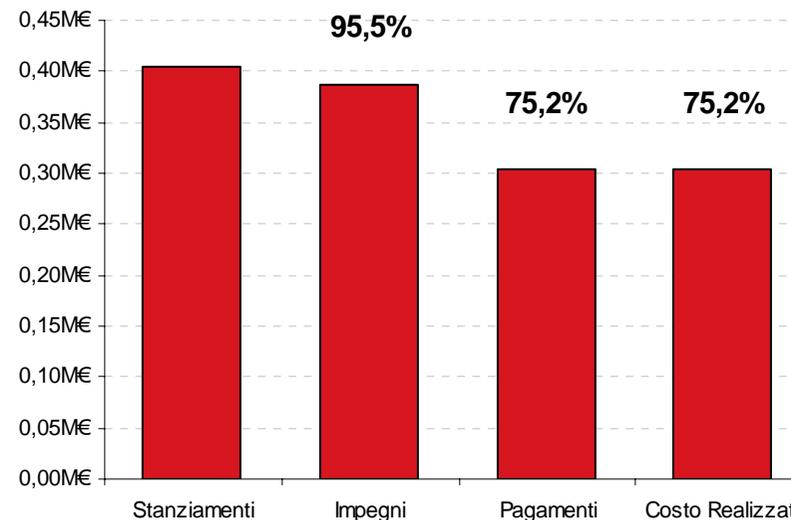

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

30 - DF30 - Consolidamento versanti franosi lungo la SS 198 pressi Km 79 - Comune di Gairo

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 137.444,70

% impegnato su stanziato: 68,72%

Costo realizzato: € 0


% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

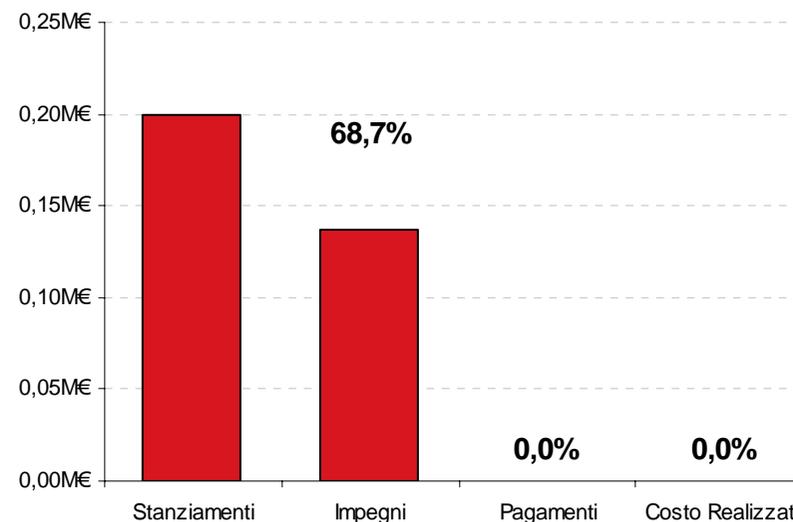

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

31 - DF31 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SP Bosa-Alghero (completamento)

Somma stanziata: € 2.200.000,00

Somma impegnata: € 1.818.092,70

% impegnato su stanziato: 82,64%


Costo realizzato: € 55.982,70

% realizzato su stanziato: 2,54%

Pagamenti: € 55.982,70

% pagato su stanziato: 2,54%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

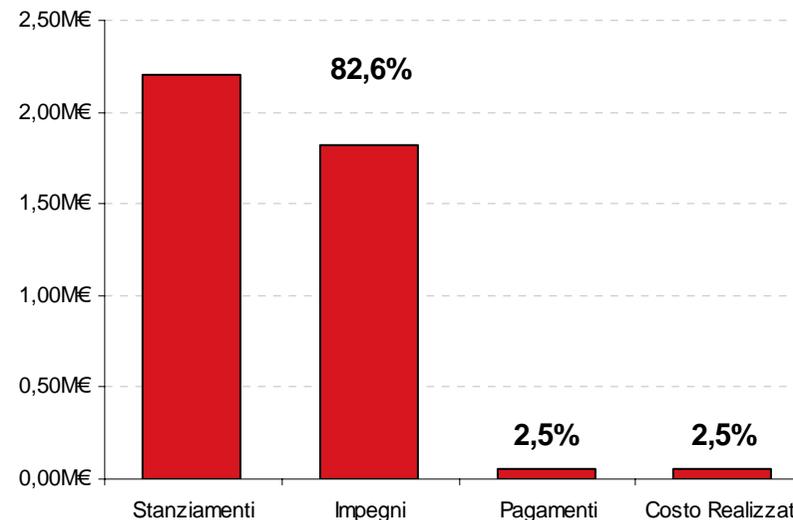

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

32 - DF33 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 nel tratto compreso tra il pianoro di Campeda e il bivio di Bonorva

Somma stanziata: € 1.120.388,38

Somma impegnata: € 1.094.454,88

% impegnato su stanziato: 97,69%

Costo realizzato: € 614.668,54


% realizzato su stanziato: 54,86%

Pagamenti: € 614.668,54

% pagato su stanziato: 54,86%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

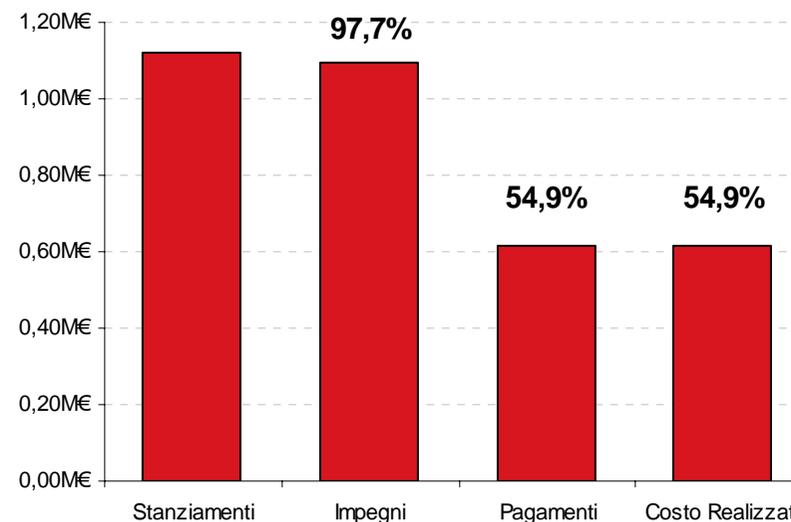

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

33 - DF34 - Opere di protezione dalla caduta di massi lungo la SS 131 in prossimità dello svincolo per Bonnanaro

Somma stanziata: € 500.000,00

Somma impegnata: € 327.814,78

% impegnato su stanziato: 65,56%

Costo realizzato: € 184.935,00


% realizzato su stanziato: 36,99%

Pagamenti: € 76.654,47

% pagato su stanziato: 15,33%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

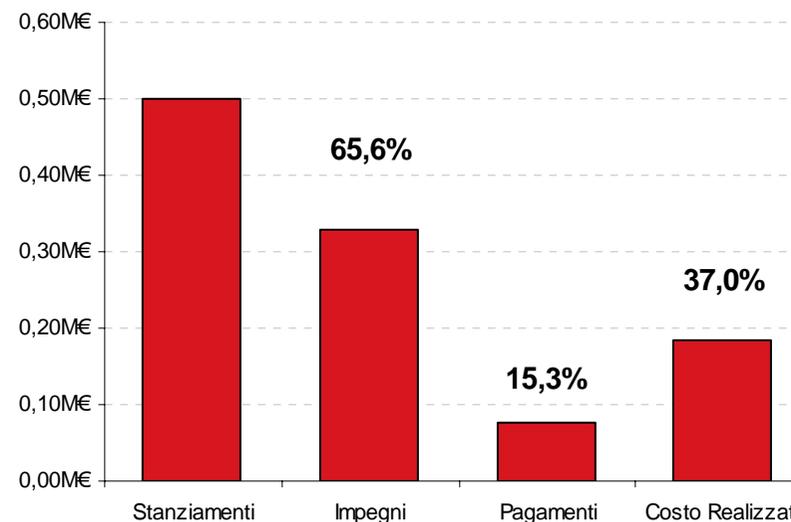

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

34 - DF35 - Opere di consolidamento dei versanti in frana lungo la SS 131 in prossimità della vallata del Mascari e la ferrovia – Comune di Sassari

Somma stanziata: € 1.519.224,34

Somma impegnata: € 1.466.278,89

% impegnato su stanziato: 96,51%

Costo realizzato: € 1.096.364,47


% realizzato su stanziato: 72,17%

Pagamenti: € 756.055,52

% pagato su stanziato: 49,77%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

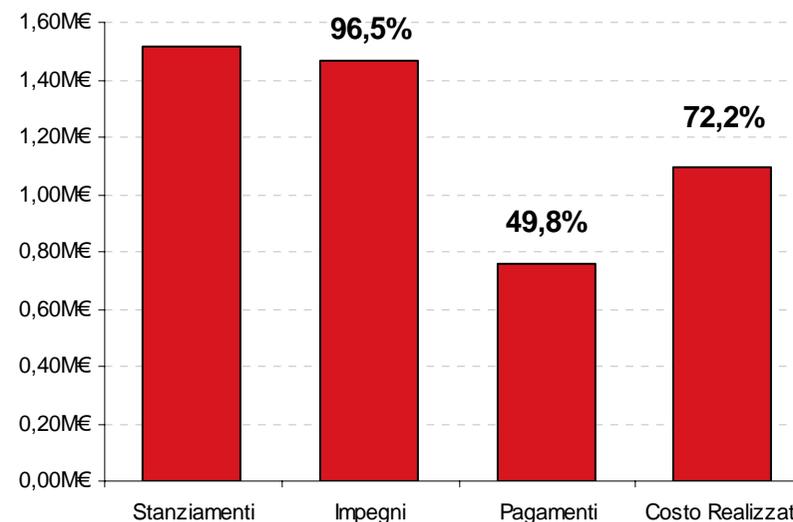

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

35 - DF37 - Consolidamento delle aree in frana lungo la strada di accesso all'abitato. Comune di Banari

Somma stanziata: € 872.760,00

Somma impegnata: € 654.961,34

% impegnato su stanziato: 75,04%

Costo realizzato: € 218.190,03


% realizzato su stanziato: 25%

Pagamenti: € 218.190,03

% pagato su stanziato: 25%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

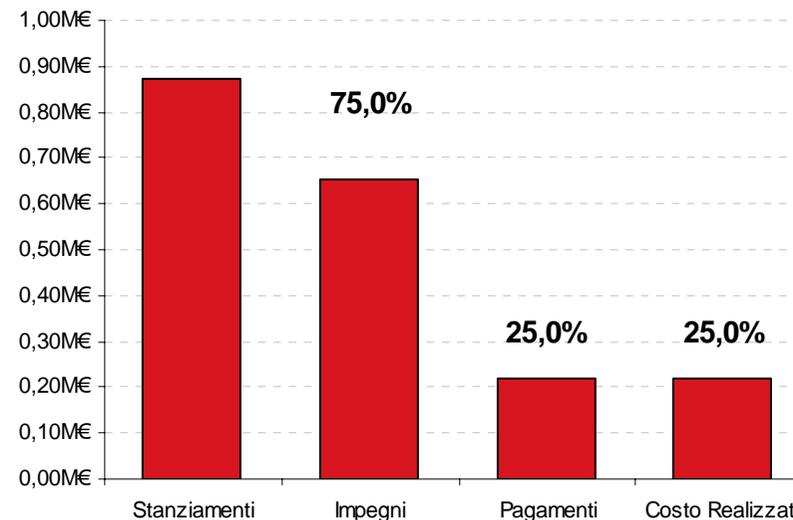

7 DIFESA DEL SUOLO

APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

36 - DF38 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di Castelsardo

Somma stanziata: € 900.000,00

Somma impegnata: € 98.576,24

% impegnato su stanziato: 10,95%


Costo realizzato: € 55.028,93

% realizzato su stanziato: 6,11%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Sospeso

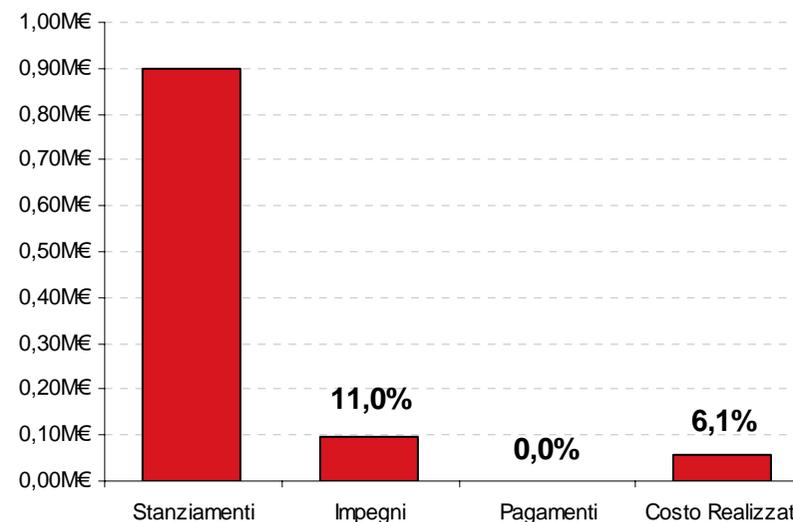

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

37 - DF39 - Consolidamento dei versanti in frana lungo la strada SS 134 nel comune di Sedini

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 241.929,31

% impegnato su stanziato: 80,64%

Costo realizzato: € 161.478,36


% realizzato su stanziato: 53,83%

Pagamenti: € 138.887,68

% pagato su stanziato: 46,3%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

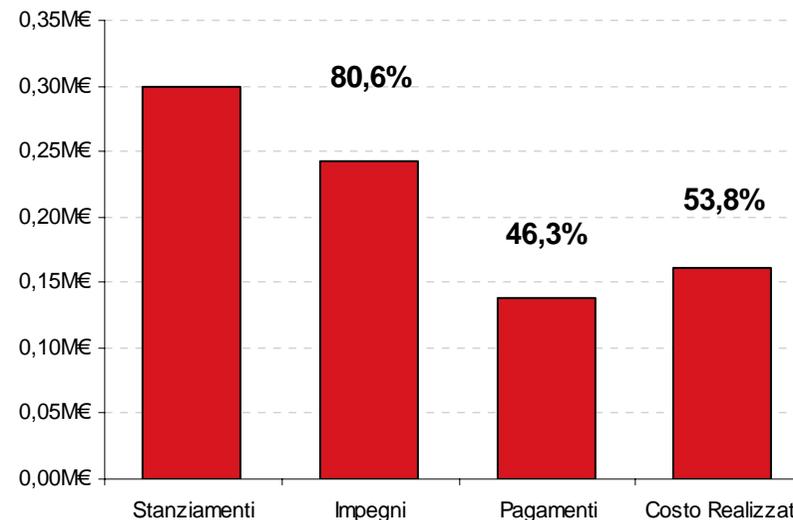

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

38 - DF41 - Sistemazione del Rio Mannu in prossimità della SP18 e adeguamento attraversamenti. (Comune di Sassari)

Somma stanziata: € 1.461.706,99

Somma impegnata: € 1.407.659,63

% impegnato su stanziato: 96,3%


Costo realizzato: € 115.777,67

% realizzato su stanziato: 7,92%

Pagamenti: € 115.777,67

% pagato su stanziato: 7,92%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.
Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

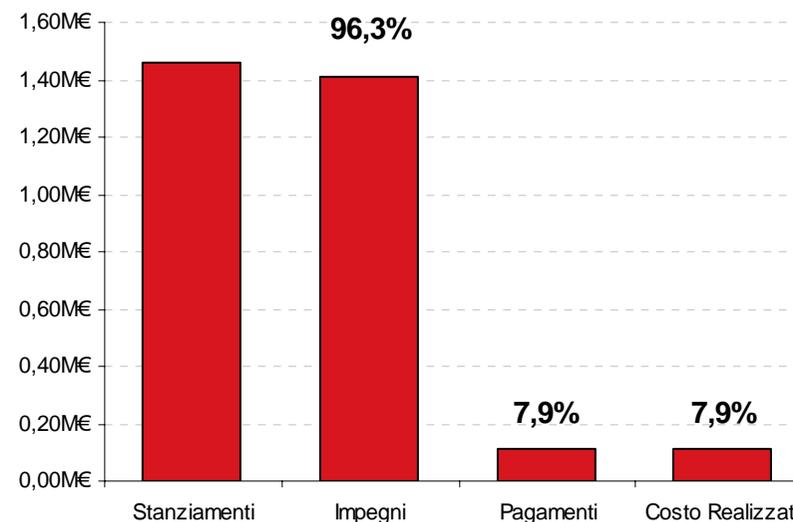

7 DIFESA DEL SUOLO APQ ORIGINARIO 31 MARZO 2004

39 - DF42 - Manutenzione e salvaguardia del sistema ambientale e naturalistico dell'asta valliva del Flumendosa. Interventi sugli argini. Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale degli argini del Flumendasa nei comuni di San Vito, Muravera e Villaputzu. 1^a fase, 1° lotto, 1° comparto

Somma stanziata: € 12.400.000,00

Somma impegnata: € 6.404.592,82

% impegnato su stanziato: 51,65%

Costo realizzato: € 454.578,00


% realizzato su stanziato: 3,67%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Appalto aggiudicato.

Contratto sottoscritto. Avviati i lavori

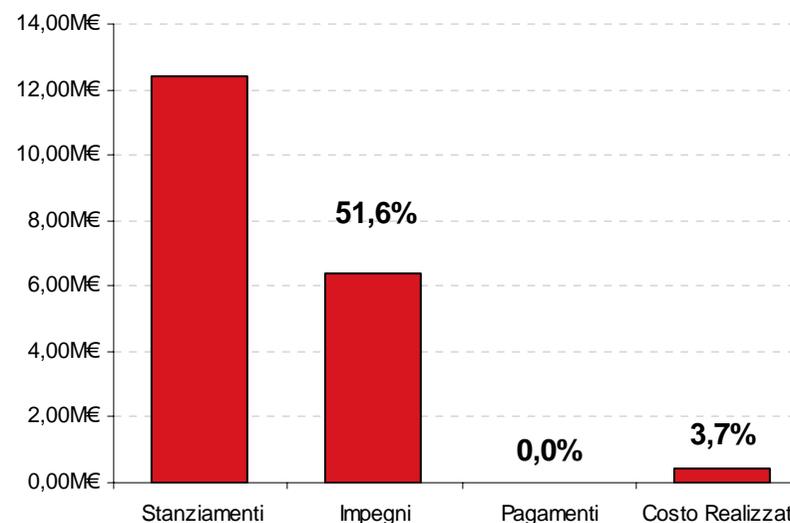

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

1 - DF43 - Fiume Cedrino. Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e Othoni. Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo

Somma stanziata: € 4.800.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: Nessun intervento

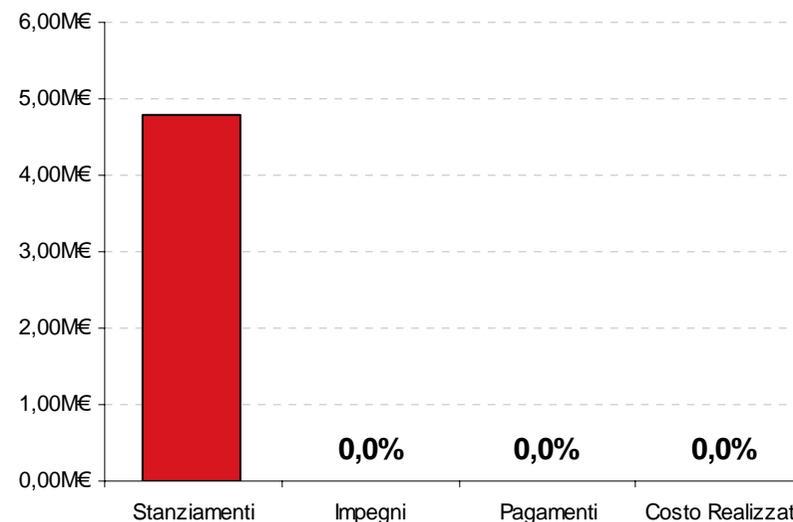

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

2 - DF44 - Fiume Posada. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga Maccheronis. Progettazione generale e 1° stralcio esecutivo

Somma stanziata: € 4.800.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

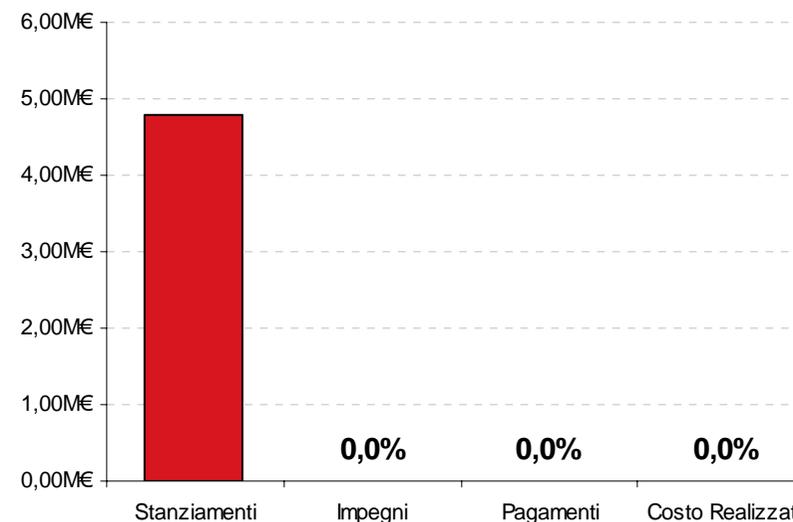

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

3 - DF45 - Interventi di ricostituzione boschiva, consolidamento di versanti a rischio di erosione a ridosso dell'abitato del Comune di Villacidro

Somma stanziata: € 400.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

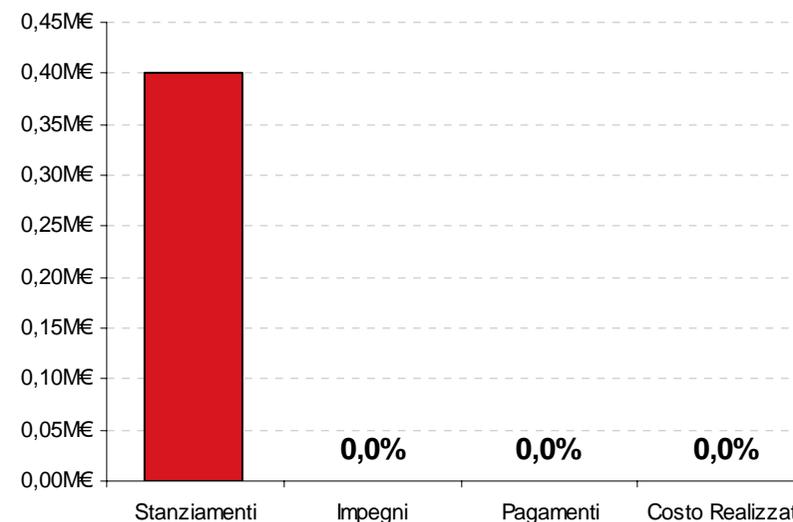

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

4 - DF46 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Flumendosa

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

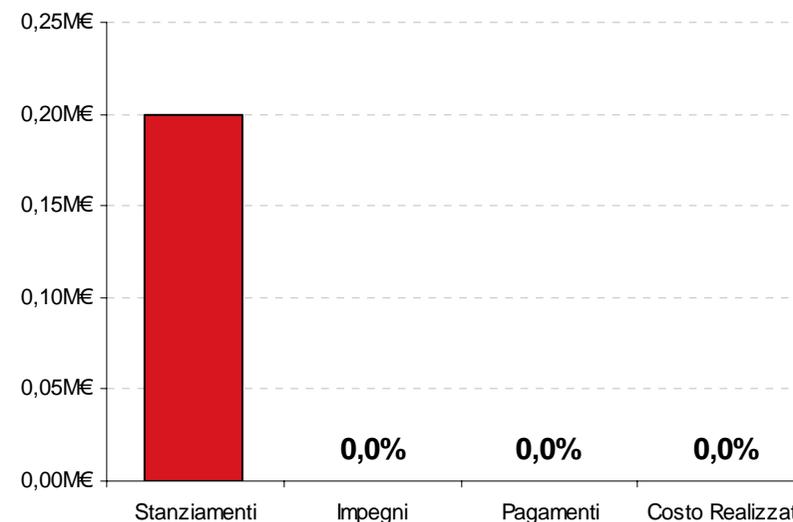

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

5 - DF47 - Studio di fattibilità interessante aree pubbliche per la realizzazione degli interventi di rinaturalizzazione e di recupero paesaggistico ed ambientale delle aree degradate dalle attività di cava nella Gallura (Comuni di Tempio Pausania, Luras, Calangianus, Luogosanto e Sant'Antonio di Gallura)

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

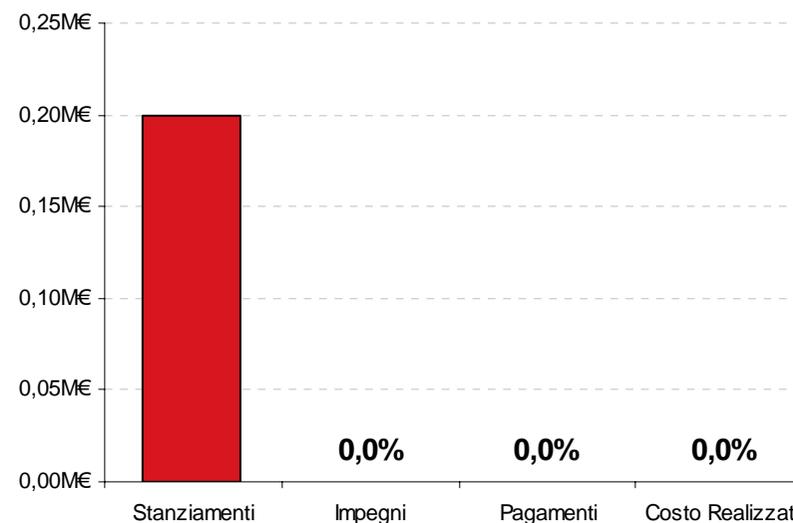

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

6 - DF48 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi necessari alla difesa delle coste e per la ridefinizione degli equilibri ambientali nelle aree a rischio di erosione nel settore nord-occidentale della Sardegna (Alghero, Sassari, Porto Torres, Castelsardo e Valledoria)

Somma stanziata: € 300.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

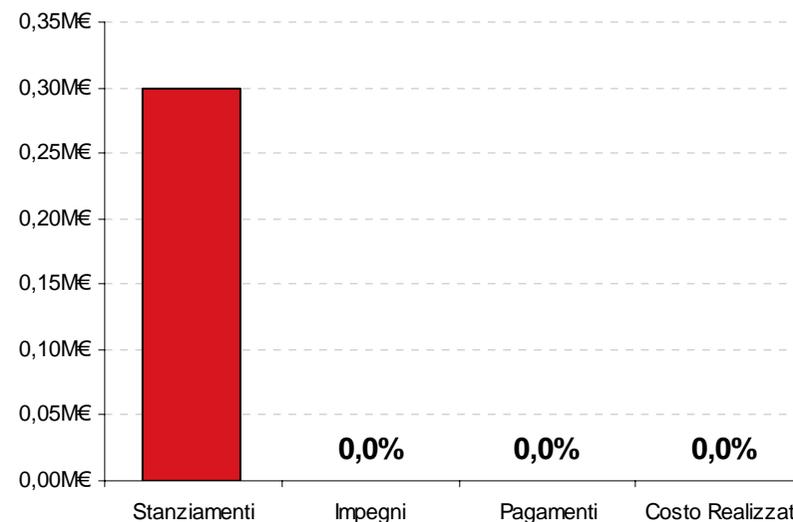

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

7 - DF49 - Studio di fattibilità per la realizzazione degli interventi prioritari di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica nel sub bacino n.7 – Flumendosa, Campidano, Cixerri del P.A.I.

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%


Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

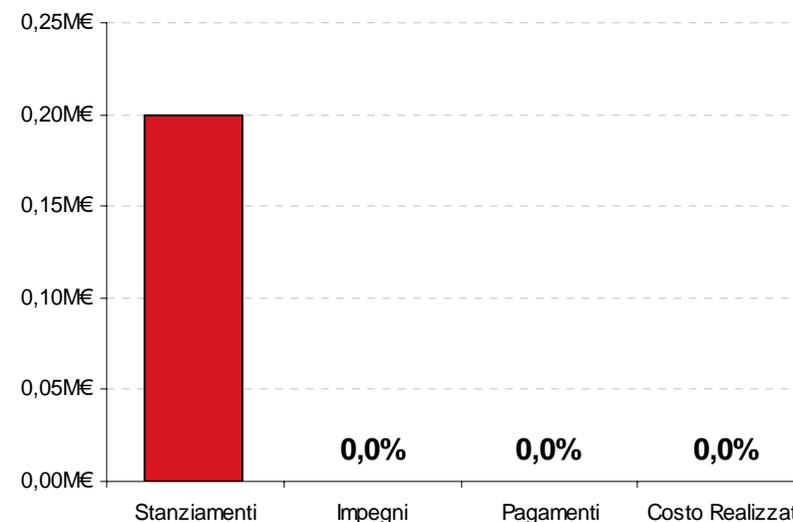

7.1 DIFESA DEL SUOLO

II ATTO INTEGRATIVO 26 OTTOBRE 2006

8 - DF50 - Studio di fattibilità per la realizzazione di interventi prioritari di riassetto idrogeologico e recupero paesaggistico e ambientale della bassa valle del Coghinas

Somma stanziata: € 200.000,00

Somma impegnata: € 0,00

% impegnato su stanziato: 0%

Costo realizzato: € 0

% realizzato su stanziato: 0%

Pagamenti: € 0,00

% pagato su stanziato: 0%

Stato di attuazione: nessun intervento

